

E18/E39 - Koordineringsmøte 6

Arkivet 26.06.2025

Arbeidsvarsling og faseplaner med veieiere og interessenter

Agenda

- Oppdatering pågående fase
- Arbeidsvarslingsplaner til nå og kommende
- Detaljfaseplaner til nå og kommende
- Overordnet faseplaner
- Fremdriftsplan
- Drift og vedlikehold
- Beredskapsplan
- Behov for særmøter kommende 3 måneder?
- Info fra deltakere (hendelser som bør hensyntas)
- Eventuelt

Kort presentasjon rundt bordet

Oppdatering pågående fase

April - 2025



Oppdatering pågående fase

Mai - 2025



Oppdatering pågående fase

Juni - 2025



Oppdatering pågående fase

- Havneområdet øst
 - Ny innkjøring til billettboader
 - Satellitten er fjernet
 - Arbeidet med Nattmannsbekken er ferdigstilt



Oppdatering pågående fase

- Duekniben
 - GS-veg er lagt om
 - Busstopp i østgående retning ved Bellevue er stengt
 - Nytt innkjøringsmønster til havne-/anleggsområdet ved Bellevue
 - Sprengningsarbeidet fortsetter



Oppdatering pågående fase

- Havneområdet vest
 - Nye billettboader ble satt i drift 13. juni.



Oppdatering pågående fase

- Video

Arbeidsvarslingsplaner – eRoom

- Planer godkjent til nå (uke 26). Totalt 48 stk.

Nr.	Plannr.	Tittel	Versjon	Type plan	Gyldig	Gyldighet fra	Gyldighet til	Profil til/fra	Aktiv	Aktivert fra	Aktivert til	Mime 360 - saksdokument nummer	Reg. av
	Grupper etter (Ingen)												
0000	APV0001	Repstad_Kolsdalen_Arbeidstillatelse og Risikoanalyse	01	Arbeidsvarslingsplan	Ja	19 sep 2024	31 des 2024					Repstad arbeidstillatelse og risikoanalyse for Kolsdalen mellomlagring	GS
0001	APV002	APV202413950-T1 Vesterveien	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	2 des 2024	19 sep 2025		Ja	✓			ORHO
0002	0003	APV202413950-T2 E39 Vesterveien - Arbeid på havna - Fase A1	2	Arbeidsvarslingsplan	Ja	9 des 2024	19 sep 2025		Ja	9 des 2024	19 sep 2025		KLB
0003	0004	24-491 KV18470 Kolsdalen - Massetransport	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	9 des 2024	1 jan 2027		Ja	9 des 2024	1 jan 2027		KLB
0004	0005	APV202414697-T1 E18 Gartnerløkka - Kuminspeksjon	1	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 16 des 2024	✓ 19 des 2024		Nei	✓ 18 des 2024	✓ 19 des 2024		KLB
0005	0006	APV202414703-T1 E18 Gartnerløkka - Frigjøre røtter	1	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 16 des 2024	✓ 28 feb 2025		Nei				KLB
0006	0007	APV20245545-T1 Pv19480 Gartnerløkka - Boreprosjekt - Del 0	1	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 29 mai 2024	✓ 30 jun 2024		Nei				KLB
0007	0008	APV20245545-T2 Pv19480 Gartnerløkka - Boreprosjekt - Del 0	2	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 29 mai 2024	✓ 30 nov 2024		Nei				KLB
0008	0009	APV20245584-T1 E39 Gartnerløkka - Boreprosjekt - Del 1	1	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 31 mai 2024	✓ 30 jun 2024		Nei				KLB
0009	0010	APV20246384-T1 E39 Gartnerløkka - Boreprosjekt - Del 2	1	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 10 jun 2024	✓ 31 aug 2024		Nei				KLB
0010	0011	APV20246384-T2 E39 Gartnerløkka - Boreprosjekt - Del 2	2	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 10 jun 2024	✓ 31 okt 2024		Nei				KLB
0011	0012	APV20246384-T3 E39 Gartnerløkka - Boreprosjekt - Del 2	3	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 10 jun 2024	✓ 30 nov 2024		Nei				KLB
0012	0013	APV20246384-T4 E39 Gartnerløkka - Boreprosjekt - Del 2	4	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 10 jun 2024	✓ 6 des 2024		Nei				KLB
0013	0014	APV20246851-T1 E39 Gartnerløkka - Boreprosjekt - Del 3	1	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 24 jun 2024	✓ 31 aug 2024		Nei				KLB
0014	0015	APV20246851-T2 E39 Gartnerløkka - Boreprosjekt - Del 3	2	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 24 jun 2024	✓ 31 okt 2024		Nei				KLB
0015	0016	APV20247293-T1 E39 Gartnerløkka - Boreprosjekt - Del 4	1	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 26 jun 2024	✓ 31 aug 2024		Nei				KLB
0016	0017	APV20247293-T2 E39 Gartnerløkka - Boreprosjekt - Del 4	2	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 26 jun 2024	✓ 31 okt 2024		Nei				KLB
0017	0018	APV20247293-T3 E39 Gartnerløkka - Boreprosjekt - Del 4	3	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 26 jun 2024	✓ 30 nov 2024		Nei				KLB
0018	0019	APV20247293-T4 E39 Gartnerløkka - Boreprosjekt - Del 4	4	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 26 jun 2024	✓ 30 nov 2024		Nei				KLB
0019	0020	APV20247658-T1 E39 Gartnerløkka - Boreprosjekt - Del 5	1	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 4 jun 2024	✓ 31 aug 2024		Nei				KLB
0020	0021	APV20247658-T2 E39 Gartnerløkka - Boreprosjekt - Del 5	2	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 4 jun 2024	✓ 31 okt 2024		Nei				KLB
0021	0022	APV202413136-T1 E39 Gartnerløkka - Boreprosjekt - Del 6	1	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 18 nov 2024	✓ 19 nov 2024		Nei				KLB
0022	0023	APV202413136-T2 E39 Gartnerløkka - Boreprosjekt - Del 6	2	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 4 des 2024	✓ 5 des 2024		Nei				KLB
0023	0024	APV202414703-T2 E18 Gartnerløkka - Krane trær	2	Arbeidsvarslingsplan	Nei	17 des 2024	31 mai 2025		Nei	14 jan 2025	31 mai 2025		KLB
0024	0025	APV2025539-T1 PV20363 Havnegata - Fjellrensk rigg 4	1	Arbeidsvarslingsplan	Nei	16 jan 2025	1 mai 2025		Nei	23 jan 2025	31 mai 2025		KLB
0025	0026	APV2025535-T1 PV19480 Vesterveien - Trefelling - K50 Portal	1	Arbeidsvarslingsplan	Nei	✓ 1 feb 2025	✓ 31 mai 2025		Nei				KLB
0026	0027	APV2025535-T2 PV19480 Vesterveien - Trefelling - K50 Portal	2	Arbeidsvarslingsplan	Ja	27 jan 2025	1 mai 2025		Nei	27 jan 2025	31 jan 2025		KLB
0027	0028	APV20251889-T1 FV471 Vestre Strandgate Quadrum - Anleggstrafikk	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	25 feb 2025	30 apr 2025		Ja				KLB
0028	0029	25/07011-2 Midlertidig anleggsavkjørsel ved fv. 471 Vestre Strandgate ved Quadrum i Kristiansand kommune	1	Avkjørselstillatelse	Ja	25 feb 2025			Ja				KLB
0029	0030	25_47718-2 E39 Circle K Vest - Vesterveien	1	Avkjørselstillatelse	Ja	5 mar 2025	10 jan 2029		Ja				KLB
0030	0031	APV20252046-T1 E39 Vesterveien - Provedgraving K23	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	6 mar 2025	30 apr 2025		Nei				KLB
0031	0032	APV20252111-T1 PV19480 Vesterveien - Arbeid på havna - Overvann	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	6 mar 2025	1 mai 2025		Nei				KLB
0032	0033	APV20252876-T1 E39 Circle K Vest - Mellomlagring av masser	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	14 mar 2025	10 jan 2029		Ja				KLB
0033	0034	APV20252910-T1 E39 Vesterveien - Grunnundersøkelser	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	17 mar 2025	31 mar 2025		Nei				KLB
0034	0035	APV20253062-T1 PV19480 Vesterveien - Omlegging av veg	1	Arbeidsvarslingsplan	Nei	20 mar 2025	1 apr 2025		Nei				KLB
0035	0036	APV20252877-T1 PV19480 Vesterveien - Sprengning	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	25 mar 2025	31 mai 2025		Nei				KLB
0036	0037	APV20253302-T1 E39 Vesterveien - Stengt PV 19480	1	Arbeidsvarslingsplan	Nei	1 apr 2025	8 jun 2026		Nei				KLB
0037	0038	APV20251889-T2 FV471 Vestre Strandgate Quadrum - Anleggstrafikk	2	Arbeidsvarslingsplan	Ja	12 feb 2025	1 aug 2025		Ja				KLB
0038	0039	APV2025539-T2 PV20363 Havnegata - Fjellrensk rigg 4	2	Arbeidsvarslingsplan	Ja	16 jan 2025	30 jun 2025		Ja				KLB
0039	0040	APV20254935-T1 E18-E39 GK - Beredskapsplan	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	28 apr 2025	28 apr 2027		Nei				KLB
0040	0041	APV20254781-T1 E39 Dueknipen - Sprengning	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	25 apr 2025	30 jun 2025						KLB
0041	0042	APV20253302-T2 E39 Vesterveien - Stengt PV 19480	2	Arbeidsvarslingsplan	Ja	1 apr 2025	8 jun 2026		Ja				KLB
0042	0043	25_47718-5 Avkjørselstillatelse - E39 Circle K Øst - Vesterveien	1	Avkjørselstillatelse	Ja							Tillatelsen gis samme gyldighetsperiode som APV-planen for tiltaket.	KLB
0043	0044	APV20255988-T1 PV20363 Havnegata - Sprengning	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	14 mai 2025	30 jun 2025						KLB
0044	0045	APV202414703-T3 E18 Gartnerløkka - Område sikring etter kraning av trær	3	Arbeidsvarslingsplan	Ja	16 des 2024	15 sep 2025						KLB
0045	0046	25-247-9 EH0005 Omlegging GS Vei	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	25 mai 2025	31 des 2029						KLB
0046	0047	APV20257128-T1 PV20363 Havnegata - Omlegging til fase A2	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	6 jun 2025	31 des 2025						KLB
0047	0048	APV20257129-T1 E39 Circle K Øst - Fjernvarme	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	12 jun 2025	31 aug 2025						KLB

Arbeidsvarslingsplaner – eRoom

- Planer godkjent til nå (uke 26). Totalt 48 stk.

	0032	APV20252111-T1	PV19480 vesterveien - Arbeid på navna - Overvann	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	6 mar 2025	1 mai 2025
	0033	APV20252876-T1	E39 Circle K Vest - Mellomlagring av masser	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	14 mar 2025	10 jan 2029
	0034	APV20252910-T1	E39 Vesterveien - Grunnundersøkelser	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	17 mar 2025	31 mar 2025
	0035	APV20253062-T1	PV19480 Vesterveien - Omlegging av veg	1	Arbeidsvarslingsplan	Nei	20 mar 2025	1 apr 2025
	0036	APV20252877-T1	PV19480 Vesterveien - Sprengning	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	25 mar 2025	31 mai 2025
	0037	APV20253302-T1	E39 Vesterveien - Stengt PV 19480	1	Arbeidsvarslingsplan	Nei	1 apr 2025	8 jun 2026
	0038	APV20251889-T2	FV471 Vestre Strandgate Quadrum - Anleggstrafikk	2	Arbeidsvarslingsplan	Ja	12 feb 2025	1 aug 2025
	0039	APV2025539-T2	PV20363 Havnegata - Fjellrensk rigg 4	2	Arbeidsvarslingsplan	Ja	16 jan 2025	30 jun 2025
	0040	APV20254935-T1	E18-E39 GK - Beredskapsplan	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	28 apr 2025	28 apr 2027
	0041	APV20254781-T1	E39 Dueknipen - Sprengning	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	25 apr 2025	30 jun 2025
	0042	APV20253302-T2	E39 Vesterveien - Stengt PV 19480	2	Arbeidsvarslingsplan	Ja	1 apr 2025	8 jun 2026
	0043	25_47718-5	Avkjørselstillatelse - E39 Circle K Øst - Vesterveien	1	Avkjørselstillatelse	Ja		
	0044	APV20255988-T1	PV20363 Havnegata - Sprengning	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	14 mai 2025	30 jun 2025
	0045	APV202414703-T3	E18 Gartnerløkka - Område sikring etter kraning av trær	3	Arbeidsvarslingsplan	Ja	16 des 2024	15 sep 2025
	0046	25-247-9	EH0005 Omlegging GS Vei	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	25 mai 2025	31 des 2029
	0047	APV20257128-T1	PV20363 Havnegata - Omlegging til fase A2	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	6 jun 2025	31 des 2025
	0048	APV20257129-T1	E39 Circle K Øst - Fjernvarme	1	Arbeidsvarslingsplan	Ja	12 jun 2025	31 aug 2025

Arbeidsvarslingsplaner – Aktive planer

- Ved Gartnerløkka:

- APV202414703-T2 - E18 Gartnerløkka – Områdesikring
- APV20251889-T2 - FV471 Vestre Strandgate Quadrum – Anleggstrafikk
- 25-247-9 - EH0005 Omlegging GS Vei

- Ved havneområdet:

- APV20253302-T2 - E39 Vesterveien – Stengt PV 19480
- APV20257128-T1 - PV20363 Havnegata - Omlegging til fase A2

- Ved Kolsdalen/Duekniben:

- 24-491-3 - KV18470 Kolsdalen – Massetransport
- APV20252876-T1 - E39 Circle K Vest – Mellomlagring av masser
- APV20257129-T1 - E39 Circle K Øst – Fjernvarme

Arbeidsvarslingsplaner – Aktive planer

- Generelt:
 - APV20254781-T1 - E39 Dueknipen - Sprengning
 - APV20255988-T1 - PV20363 Havnegata – Sprengning

Arbeidsvarslingsplaner – Kommende planer

- Ved Gartnerløkka:
 - E39 Gartnerløkka – Midlertidig rundkjøring på Gartnerløkka
 - FV471 Vestre Strandgate – Midlertidig GS-veg
- Ved havneområdet:
 - E39 Dueknipen – Sprengning
 - E39 Vesterveien – Omlegging av GS-veg ved Bellevue
 - PV20363 Havnegata – Omlegging til fase A2
 - FV471 Havnegata – Midlertidig GS-veg
- Ved Kolsdalen/Dueknipen:
 - E39 Vesterveien – Fjernvarmerør
- Generell:
 - Omlegging av GS-veg i prosjektet

Arbeidsvarslingsplaner – Kommende planer

- Ved Gartnerløkka:
 - E39 Gartnerløkka – Midlertidig rundkjøring på Gartnerløkka
- Ved havneområdet:
 - FV471 Havnegata – Midlertidig GS-veg
 - PV20363 Havnegata - Etablering av skjøtegrøp
 - PV20363 Havnegata – Omlegging til fase A3
- Ved Kolsdalen/Dueknipen:
 - PV19480 Vesterveien - Legge trekkerør for byggestrøm
 - E39 Vesterveien – Rørspunt
- Generell:
 - Omlegging av GS-veg i prosjektet

Detaljfaseplaner – Kommende planer

- Ved Gartnerløkka:
 - Midlertidig rundkjøring på Gartnerløkka
- Ved Kolsdalen/Dueknipen:
 - E39 Vesterveien – Omlegging av GS-veg ved Bellevue
 - Nye fjernvarmerør mellom havneområdet vest og varmesentral som ligger ved E39 Vesterveien i østgående retning


Detaljfaseplaner – Kommende planer

- Ved Gartnerløkka:
 - Midlertidig rundkjøring på Gartnerløkka
- Ved havneområdet:
 - FV471 Havnegata – Midlertidig GS-veg
- Ved Kolsdalen/Dueknipen:
 - E39 Vesterveien – Rørspunt

Overordnet faseplaner

Fase A1


Periode: 24.06.2024 – 14.06.2025

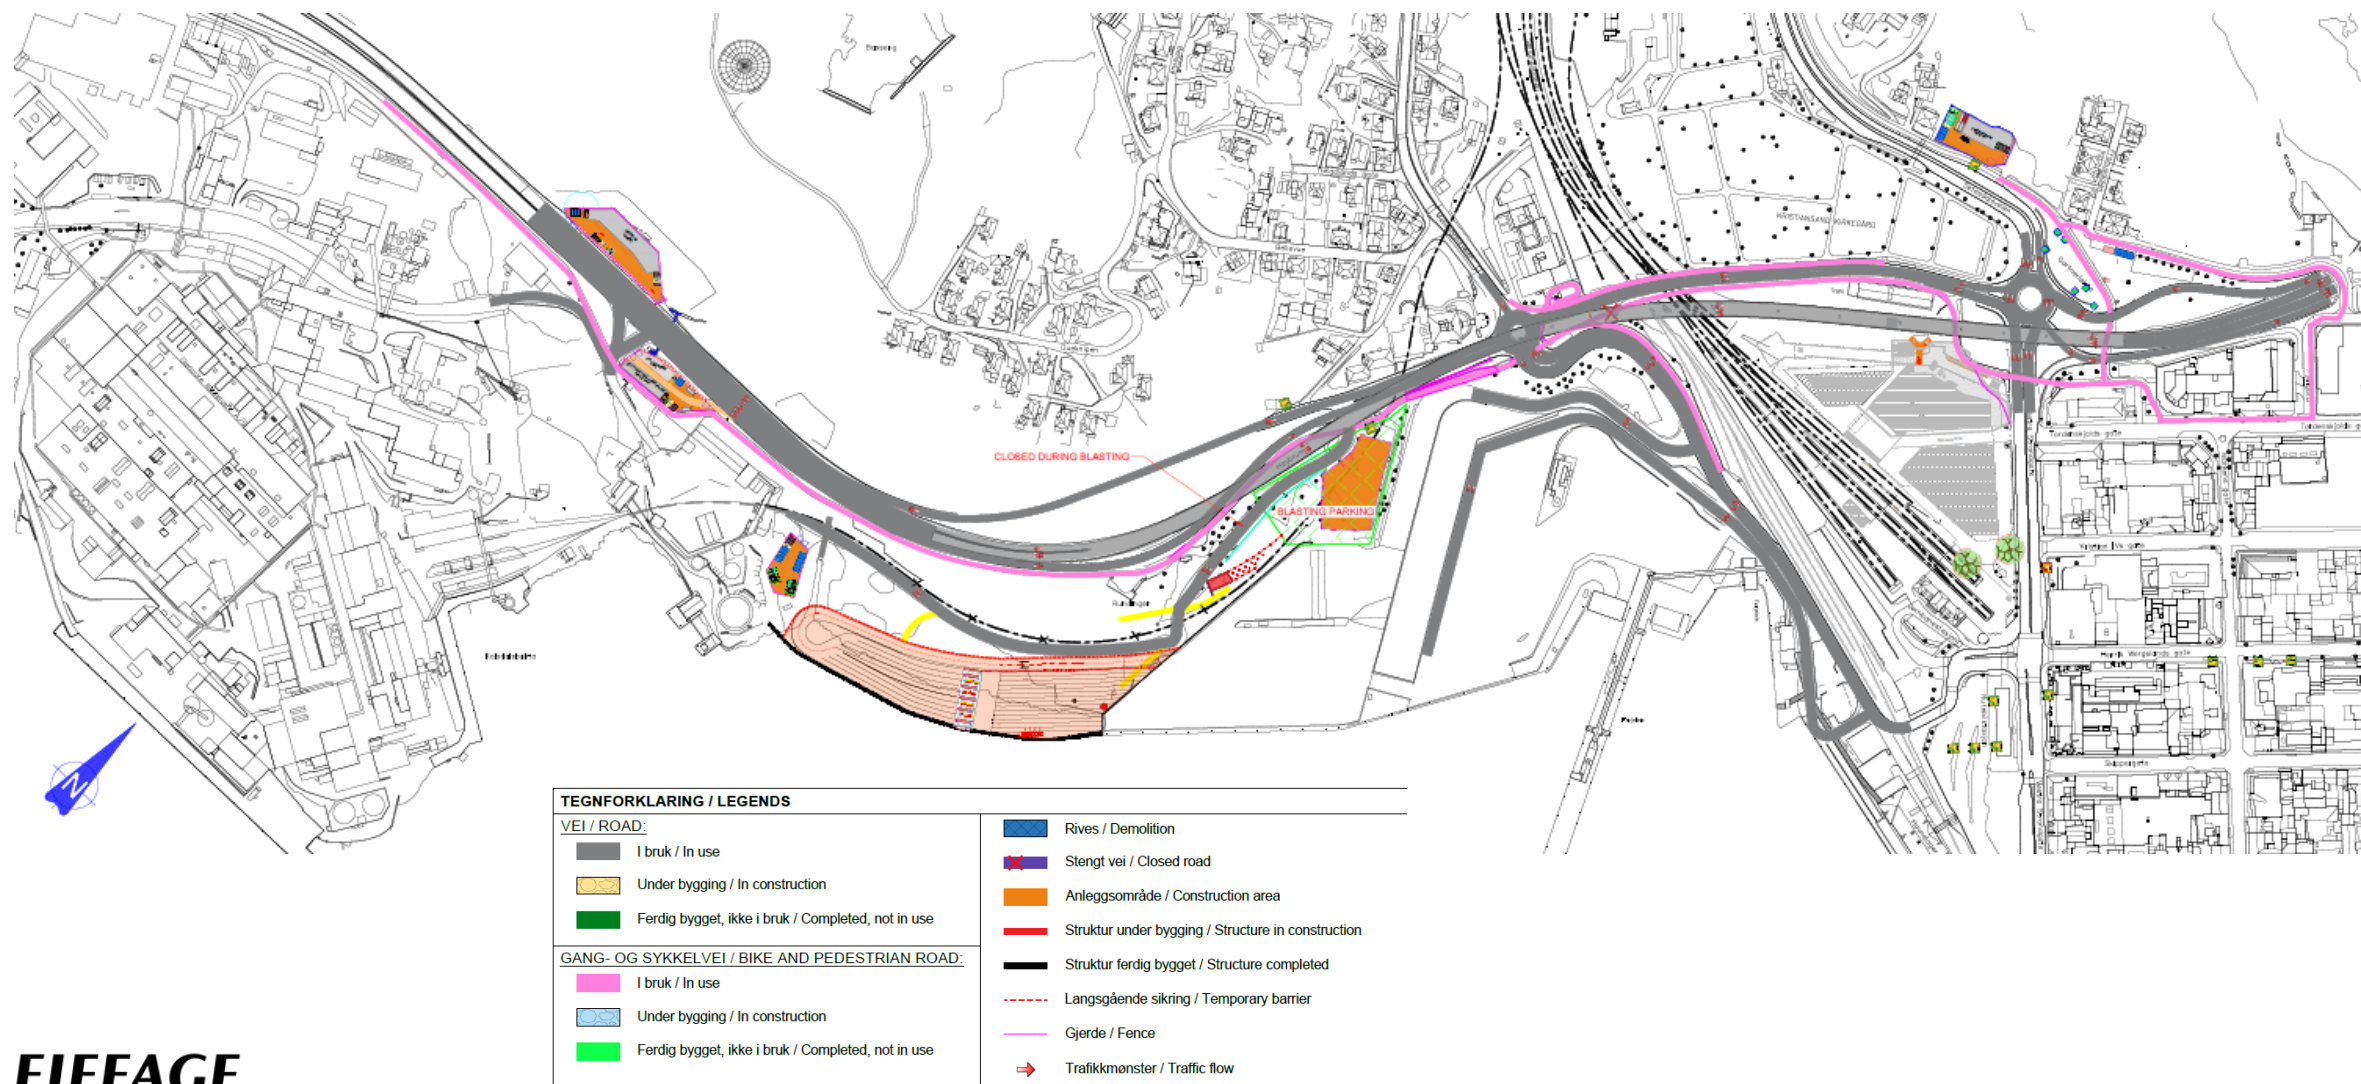

Overordnet faseplaner

Fase A2


Periode: 15.06.2025 – 08.10.2025

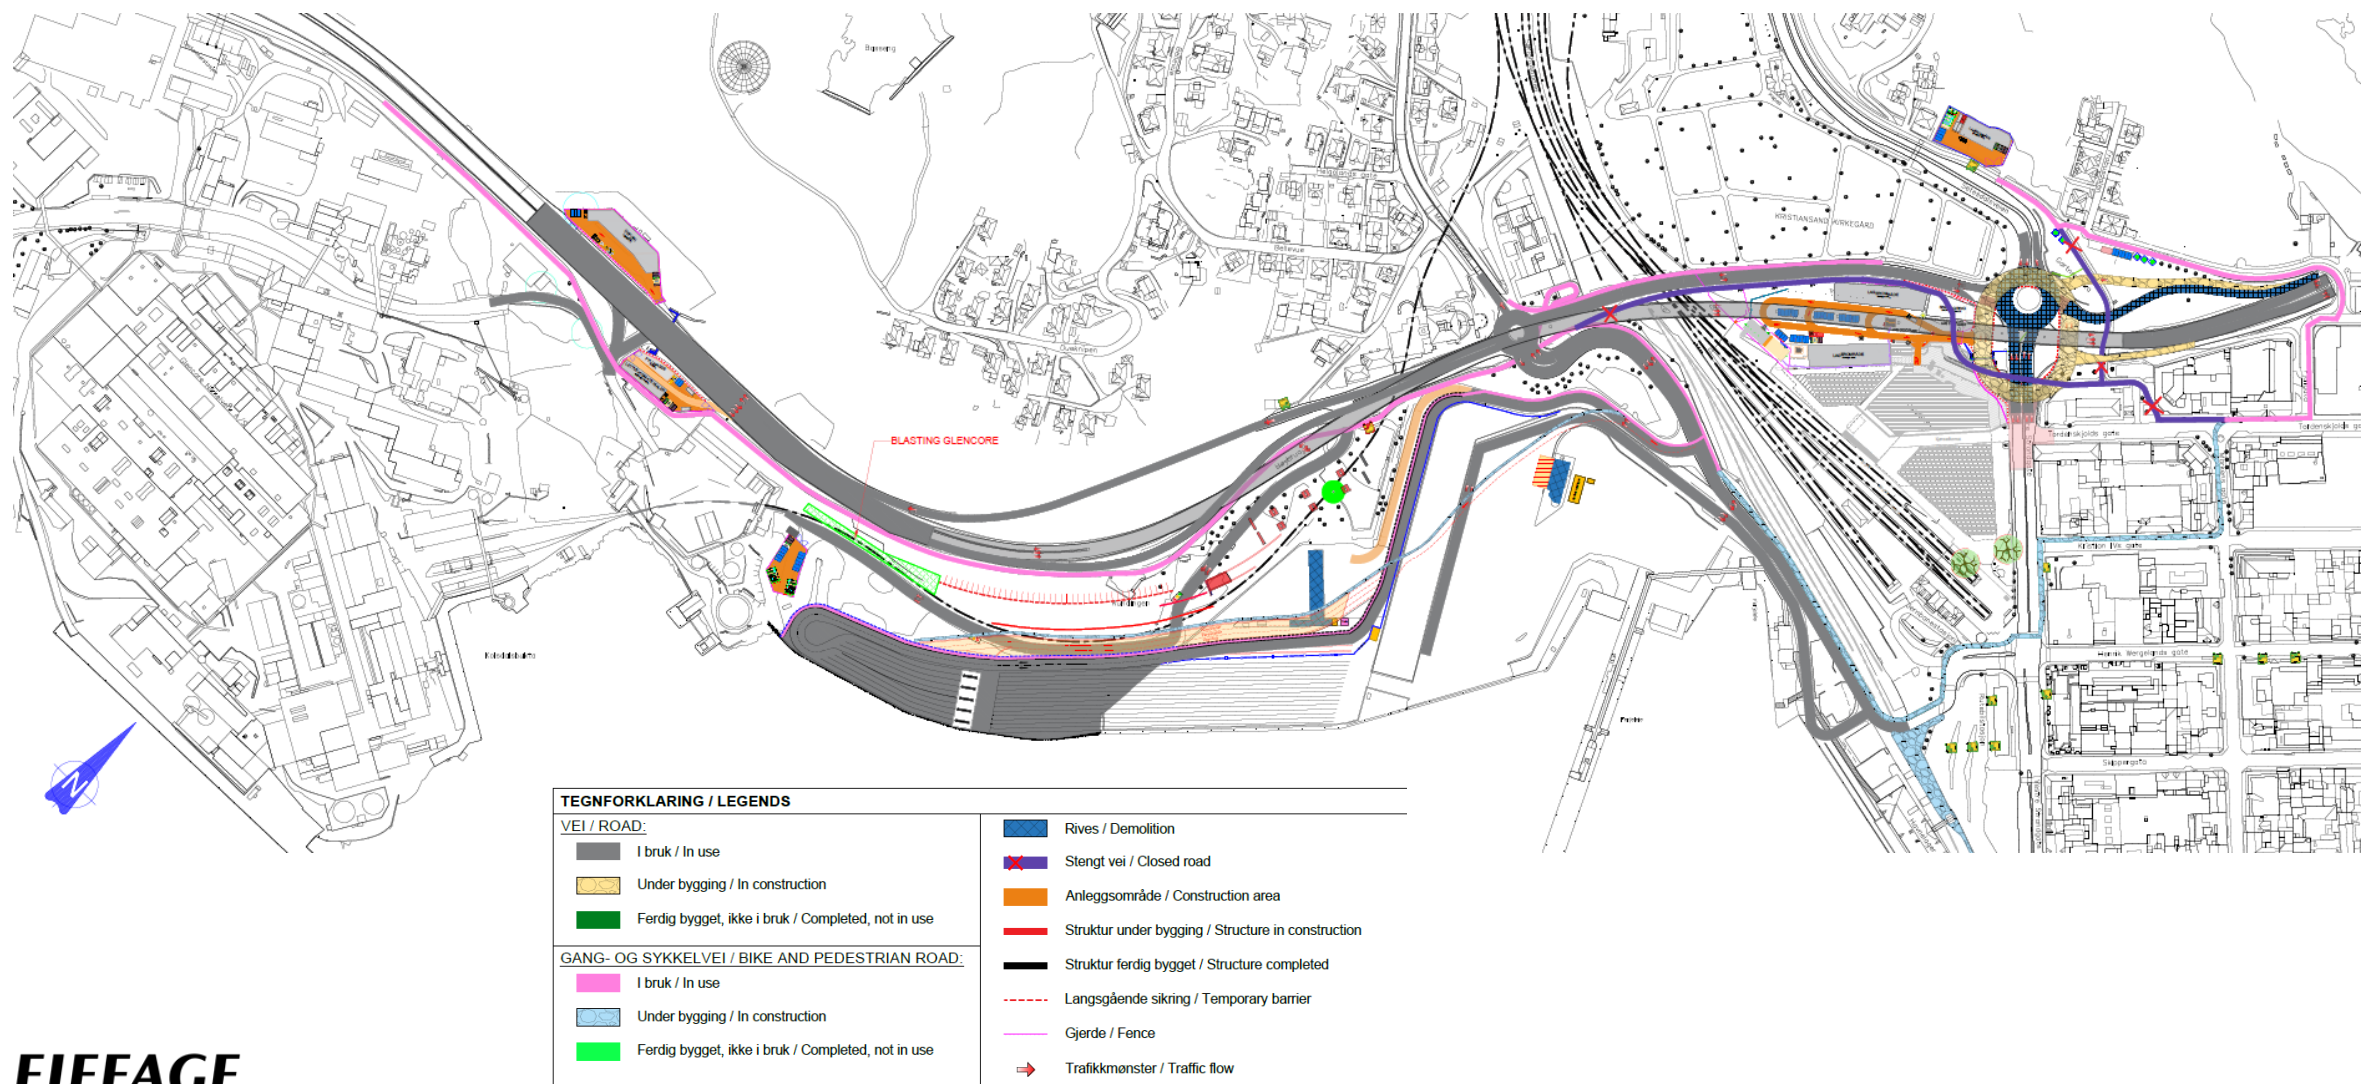

Overordnet faseplaner

Fase A3


Periode: 08.10.2025 – 22.01.2026

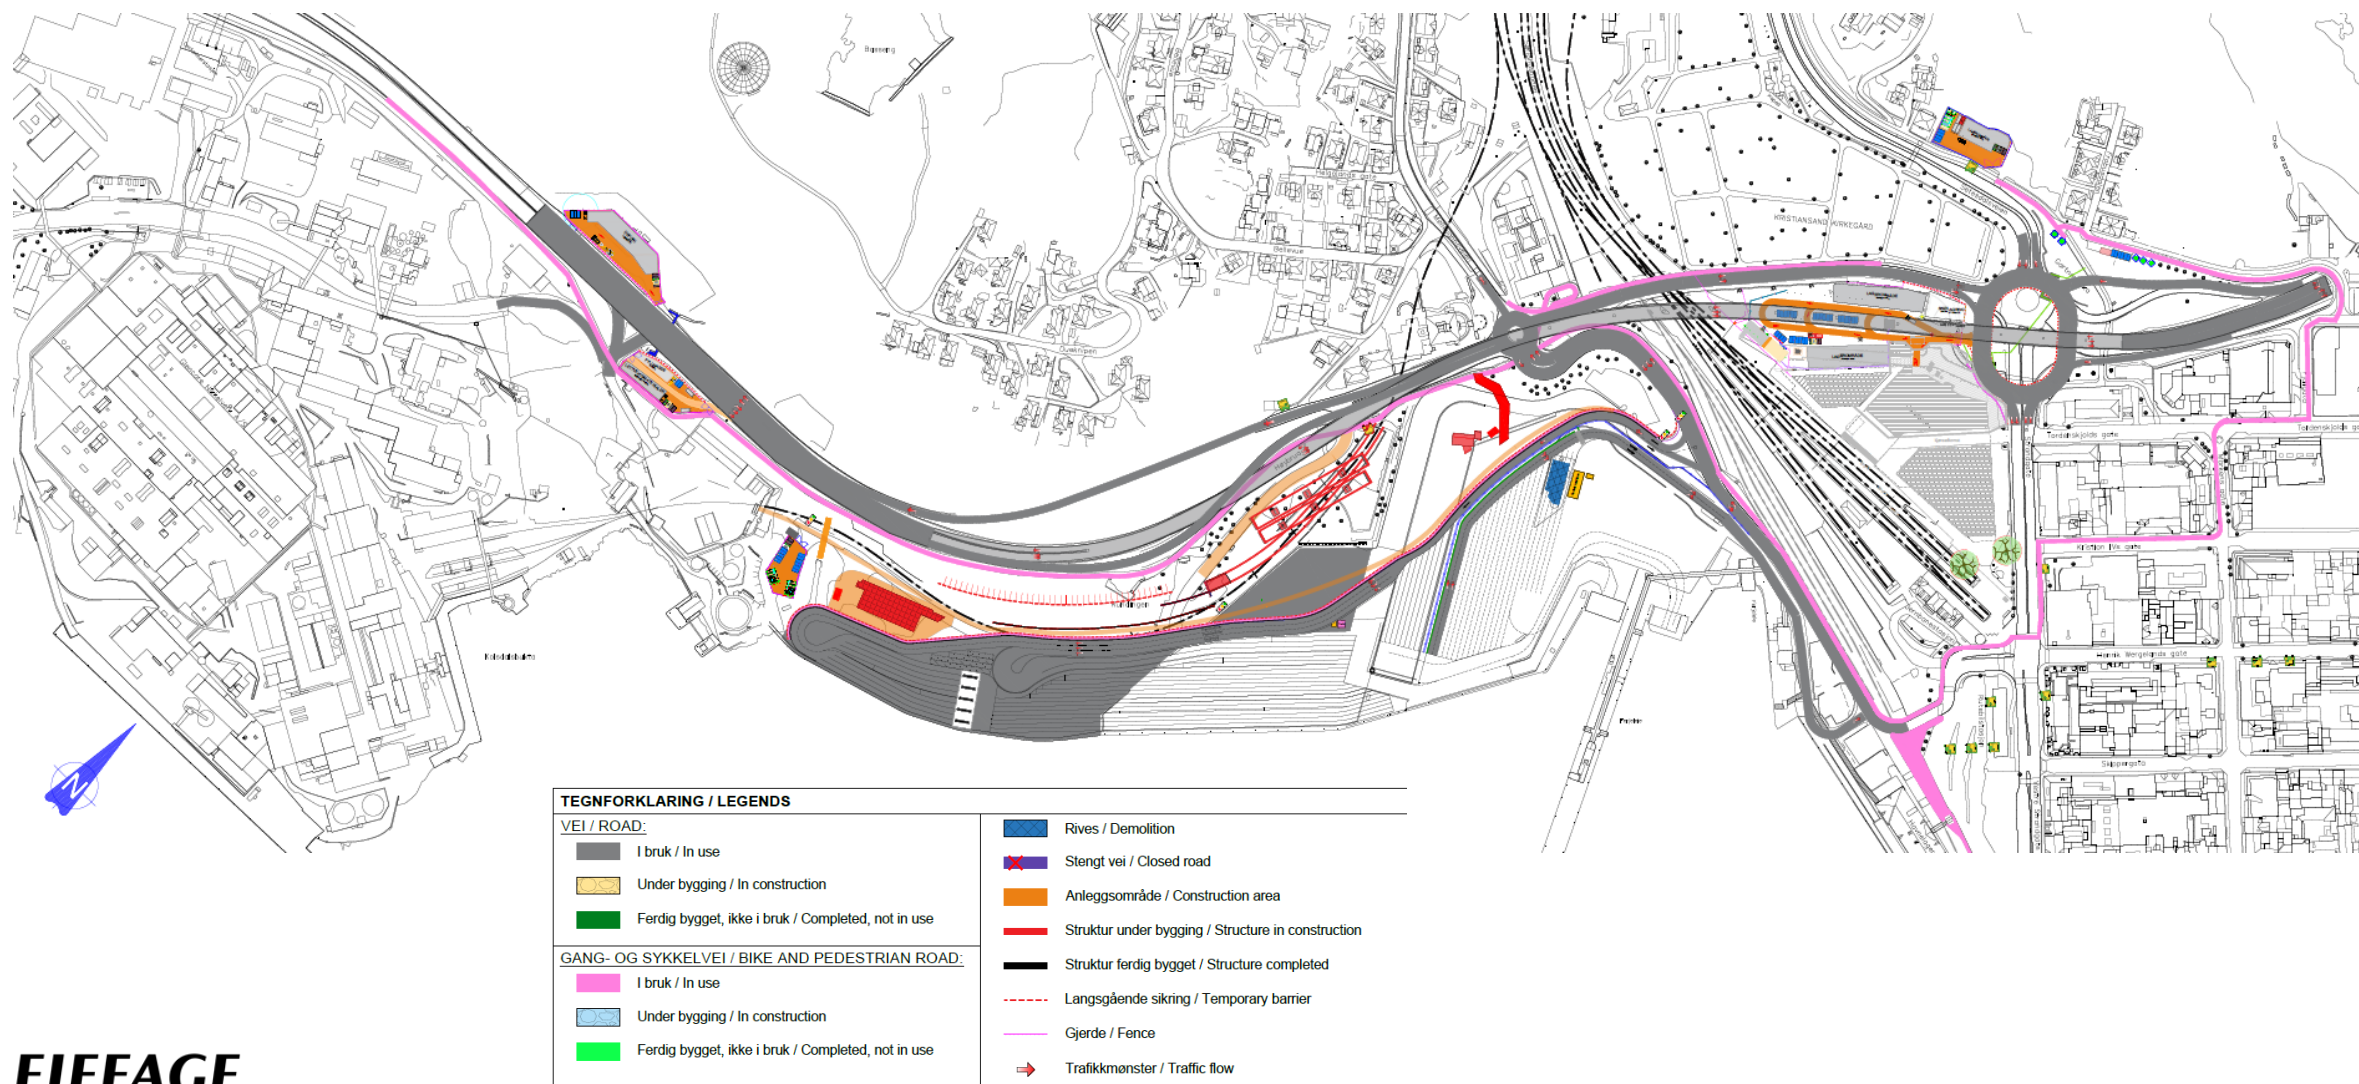

Overordnet faseplaner

Fase A4


Periode: 23.01.2026 – 18.03.2026

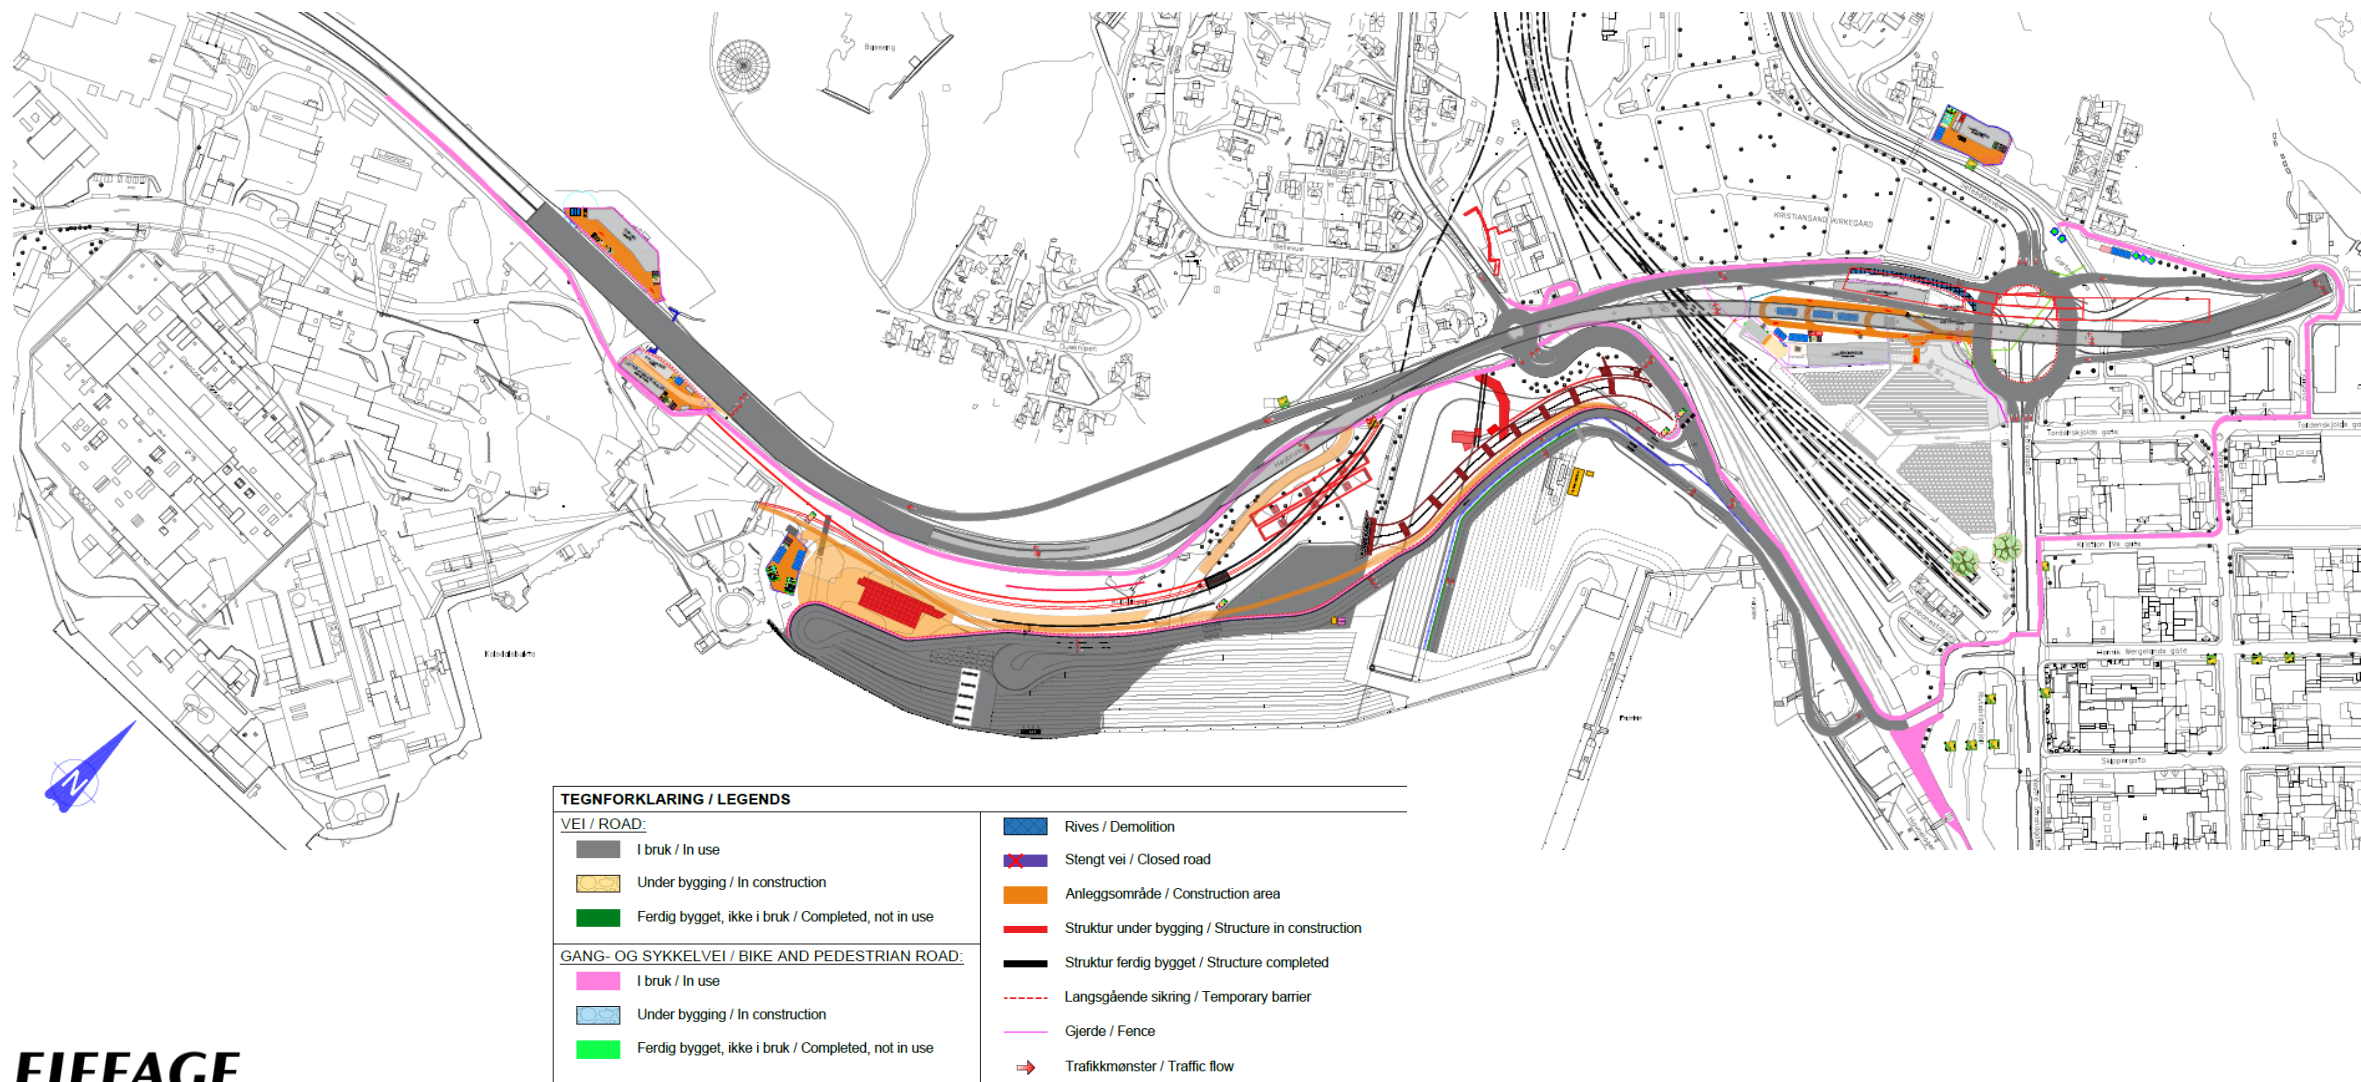

Overordnet faseplaner

Fase A5


Periode: 18.03.2026 – 15.06.2026

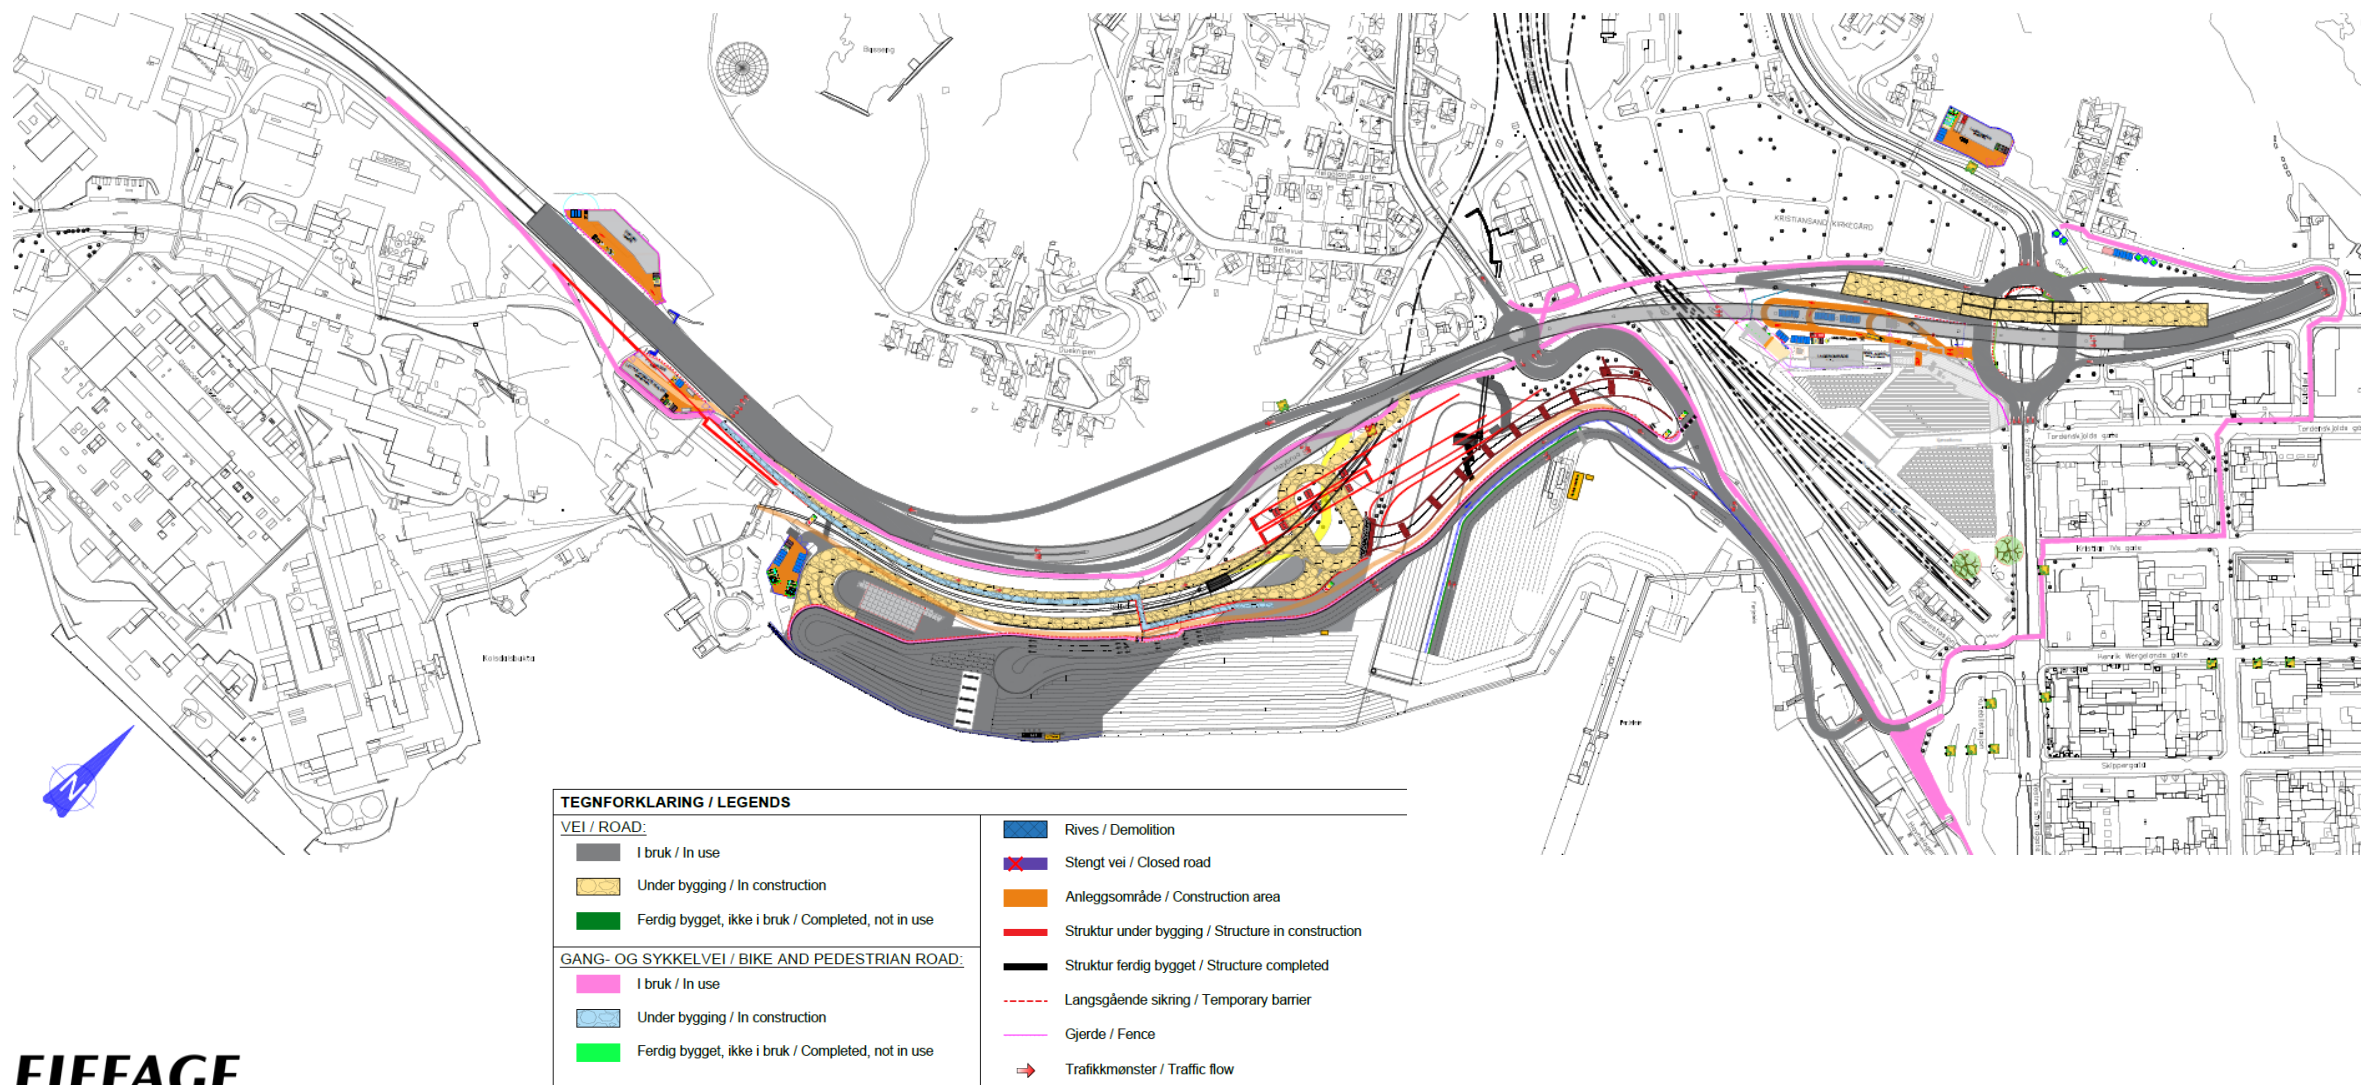

Overordnet faseplaner

Fase A6


Periode: 16.06.2026 – 26.08.2026

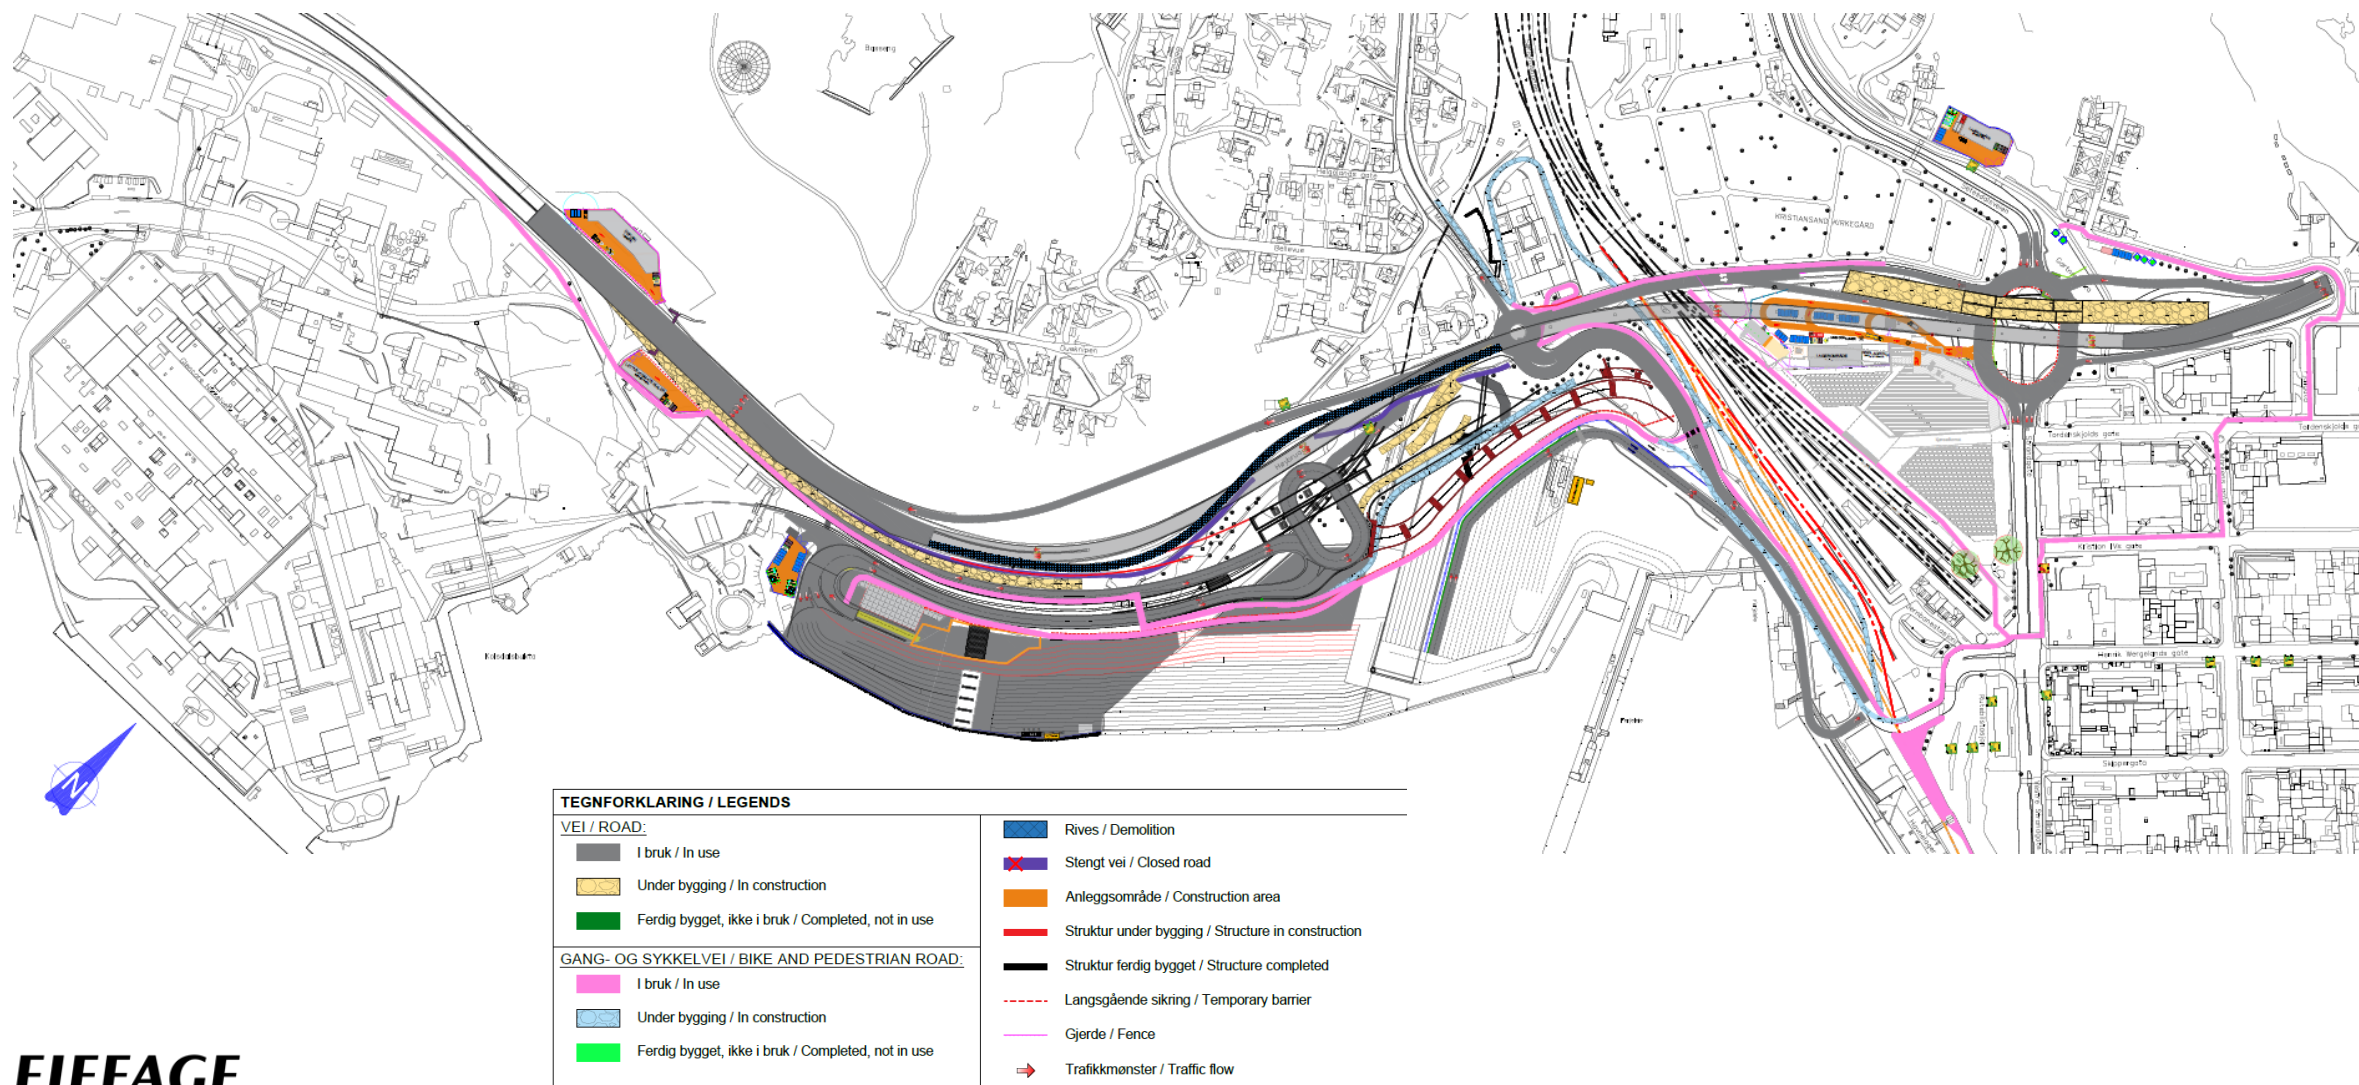

Overordnet faseplaner

Fase A7


Periode: 27.08.2026 – 10.10.2026

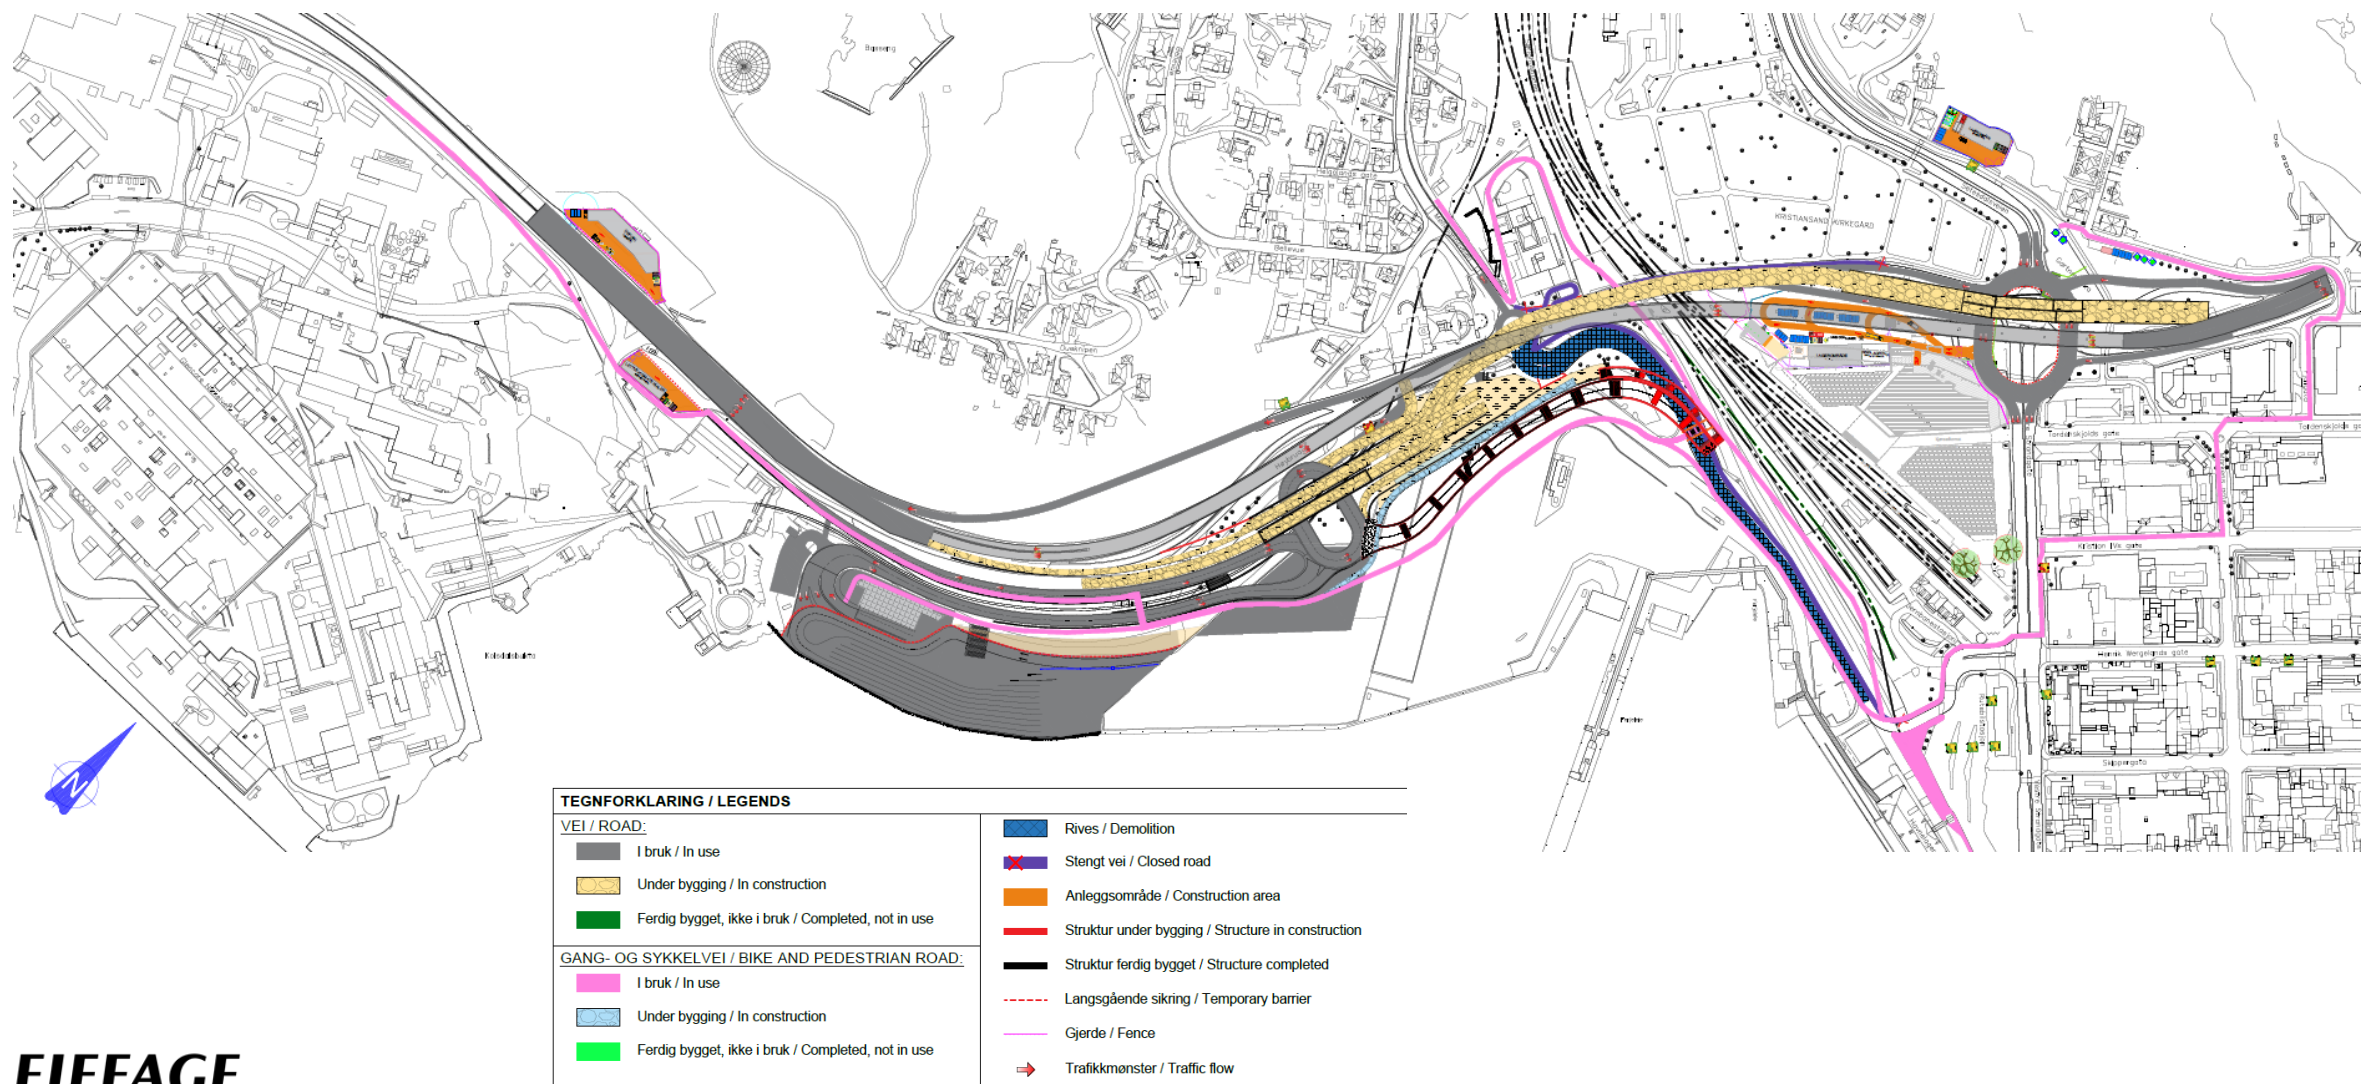

Overordnet faseplaner

Fase B.1


Periode: 10.10.2026 – 14.12.2026

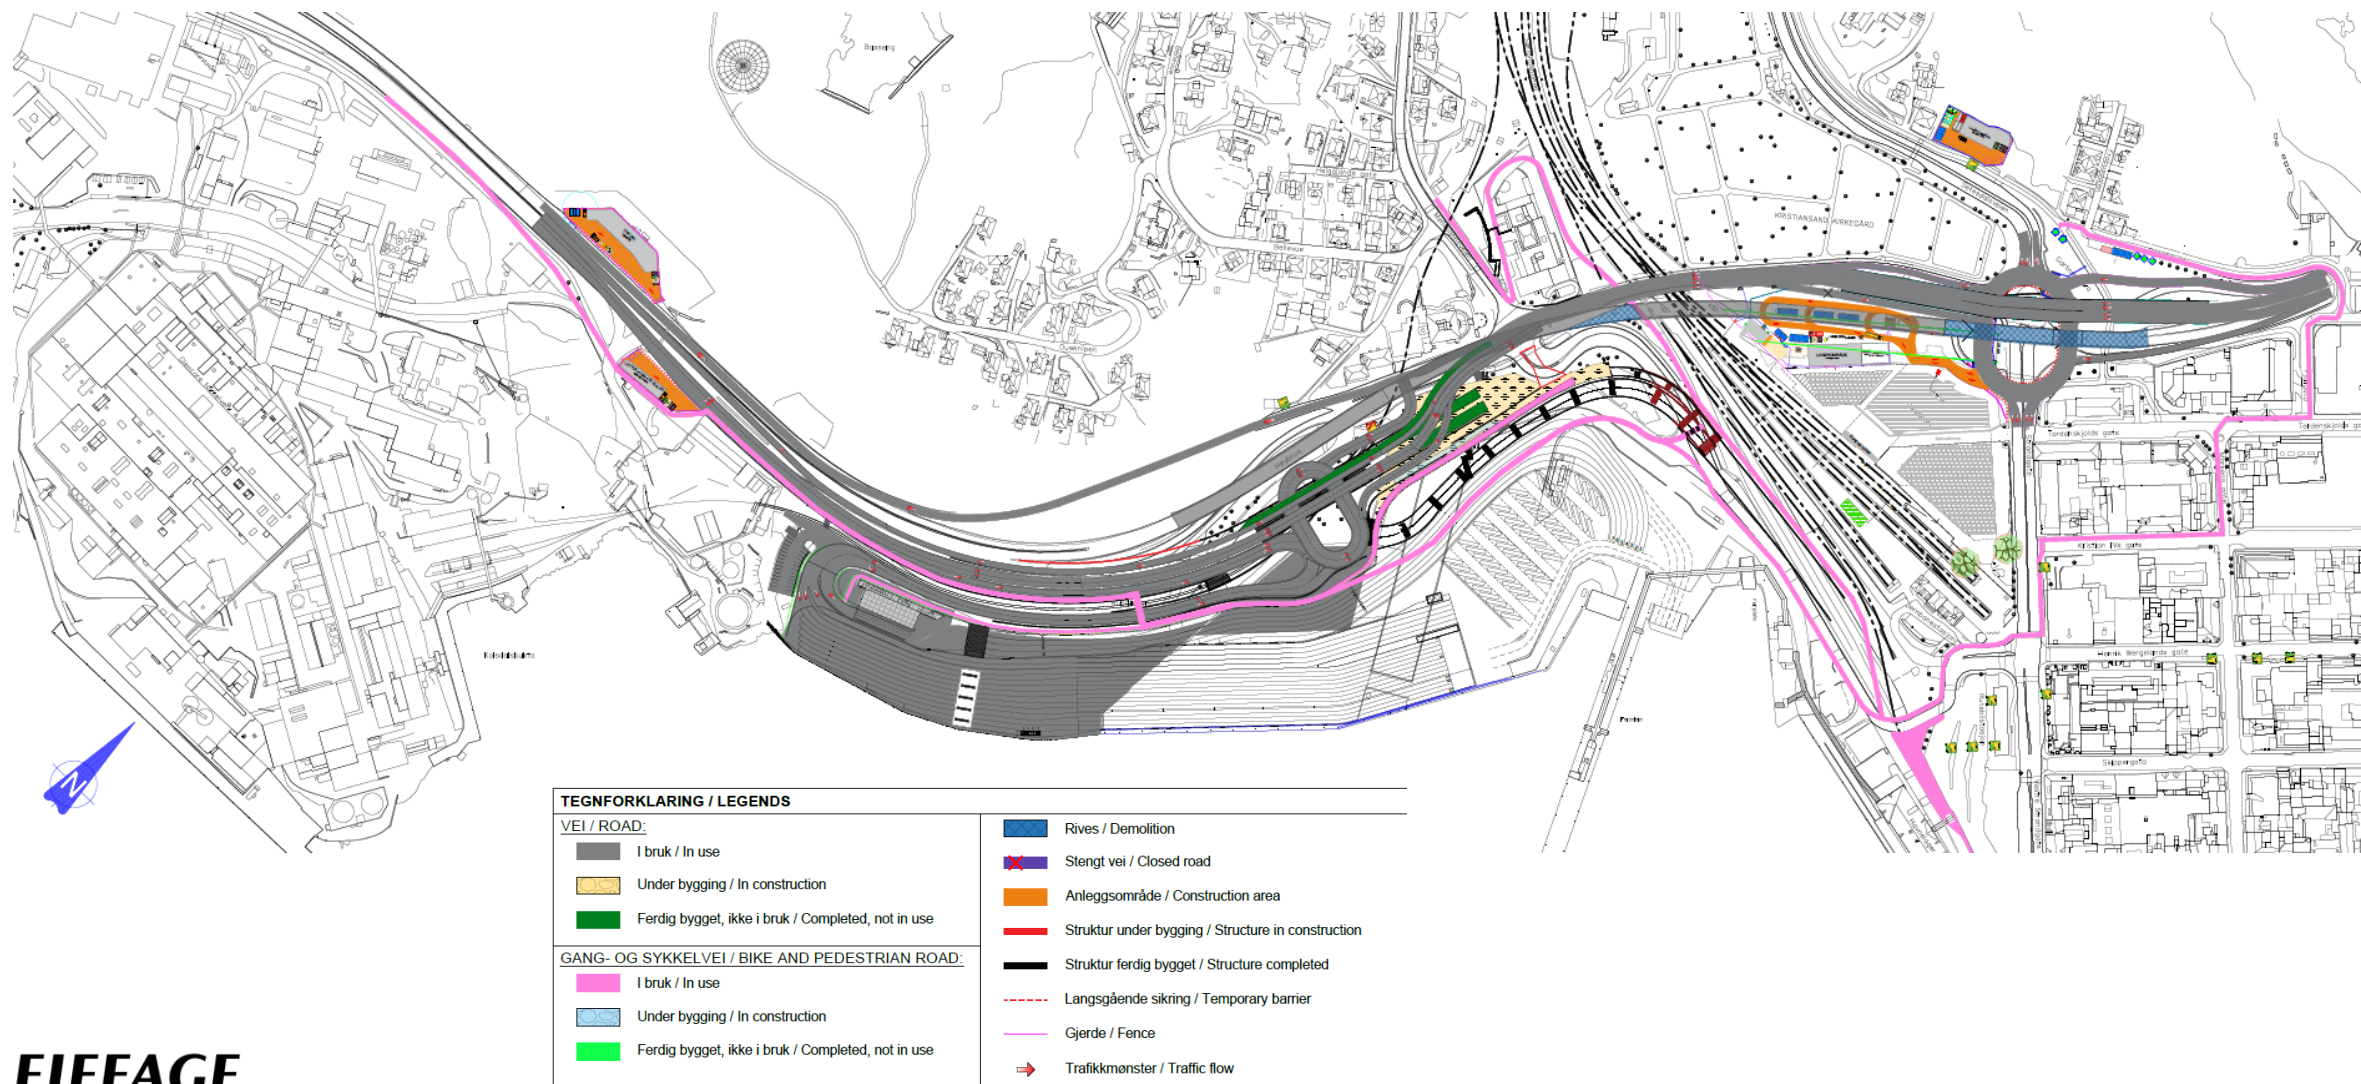

Overordnet faseplaner

Fase B.2


Periode: 04.11.2026 – 14.06.2027

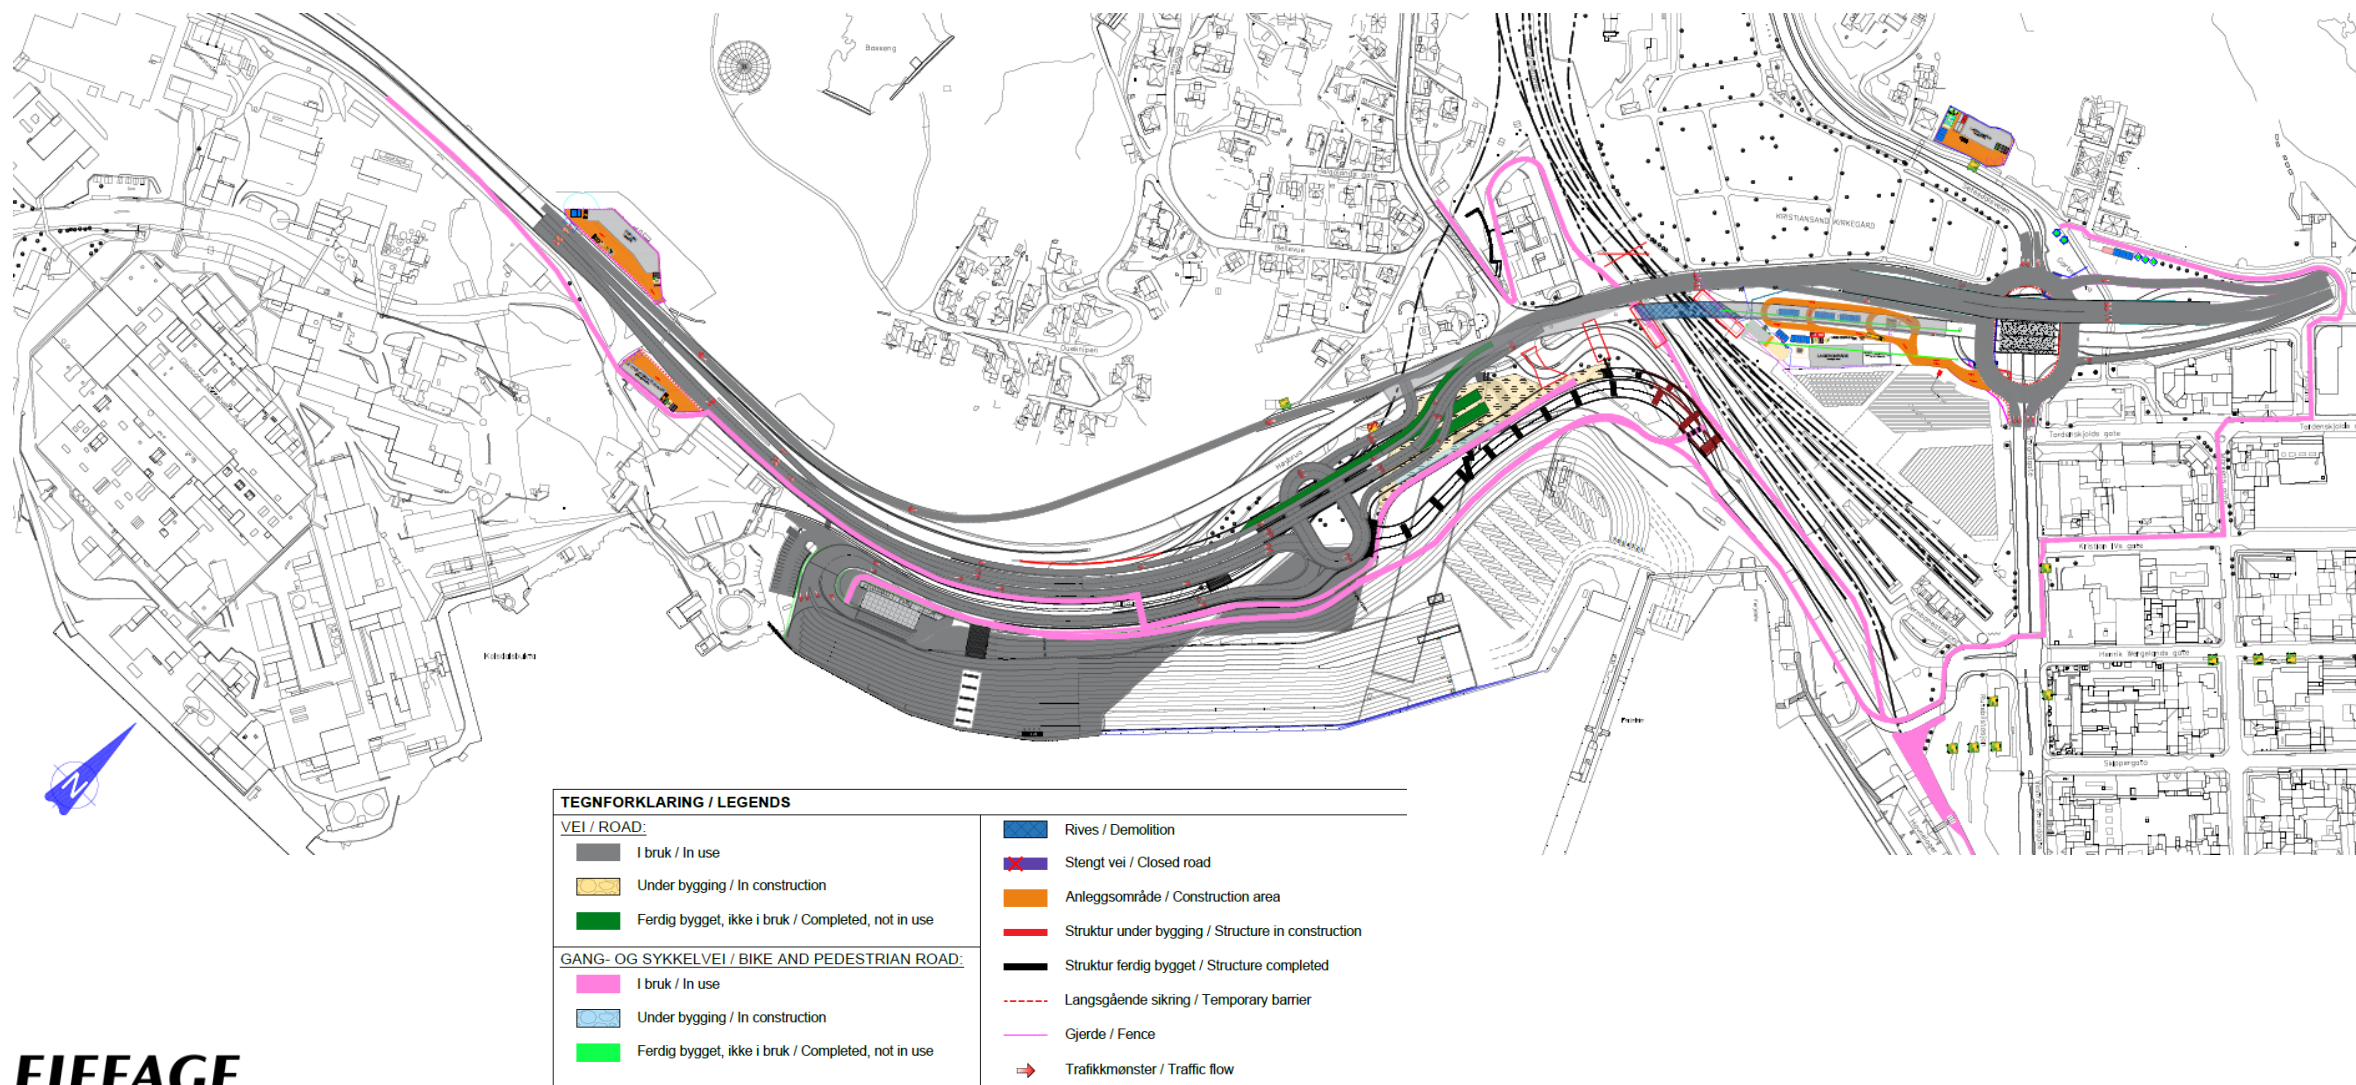

Overordnet faseplaner

Fase B.3


Periode: 16.11.2026 – 11.09.2027

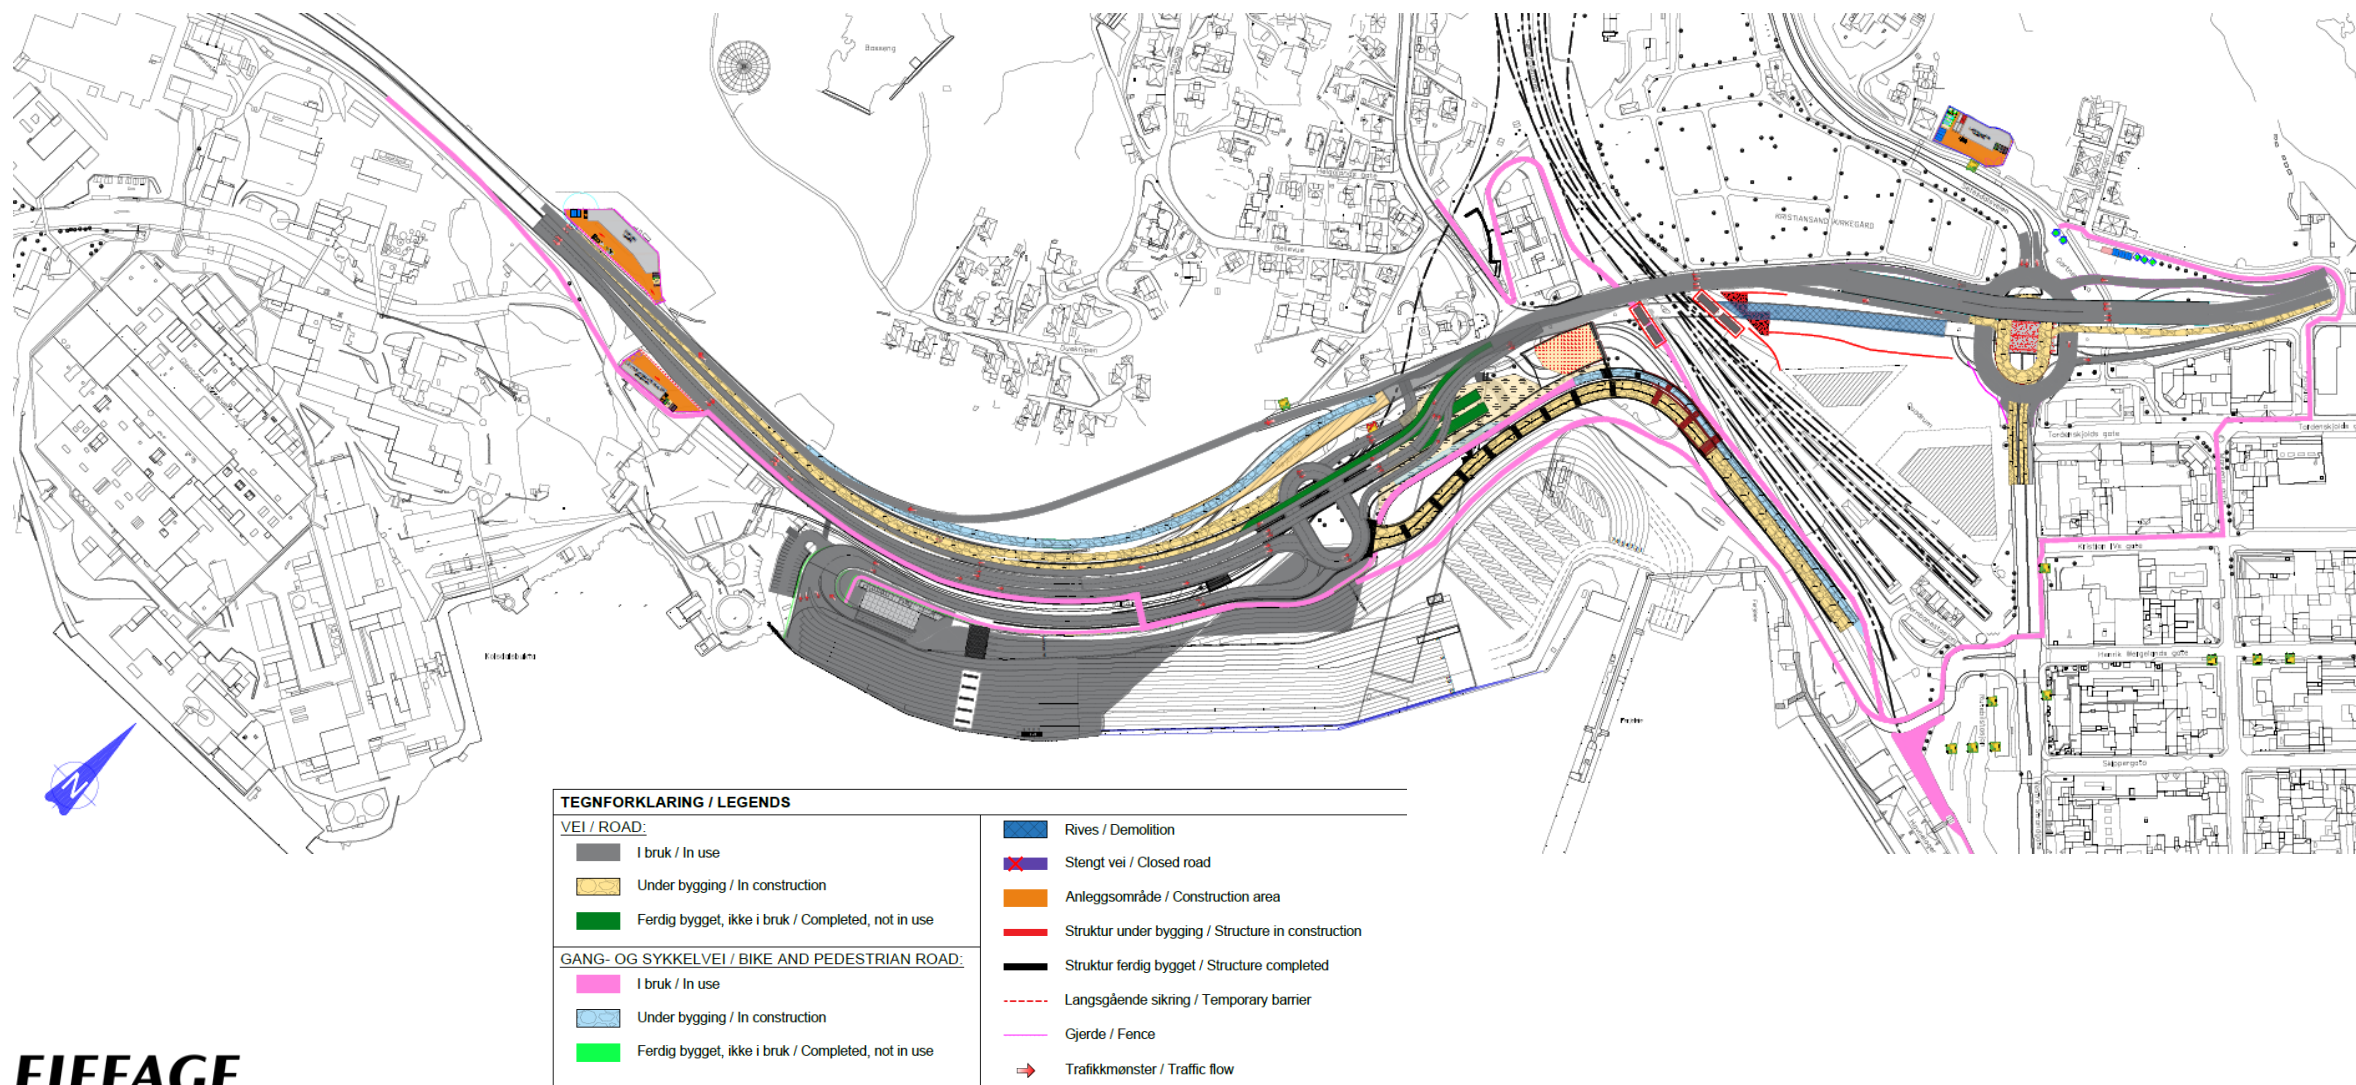

Overordnet faseplaner

Fase B.4


Periode: 30.06.2027 – 15.11.2027

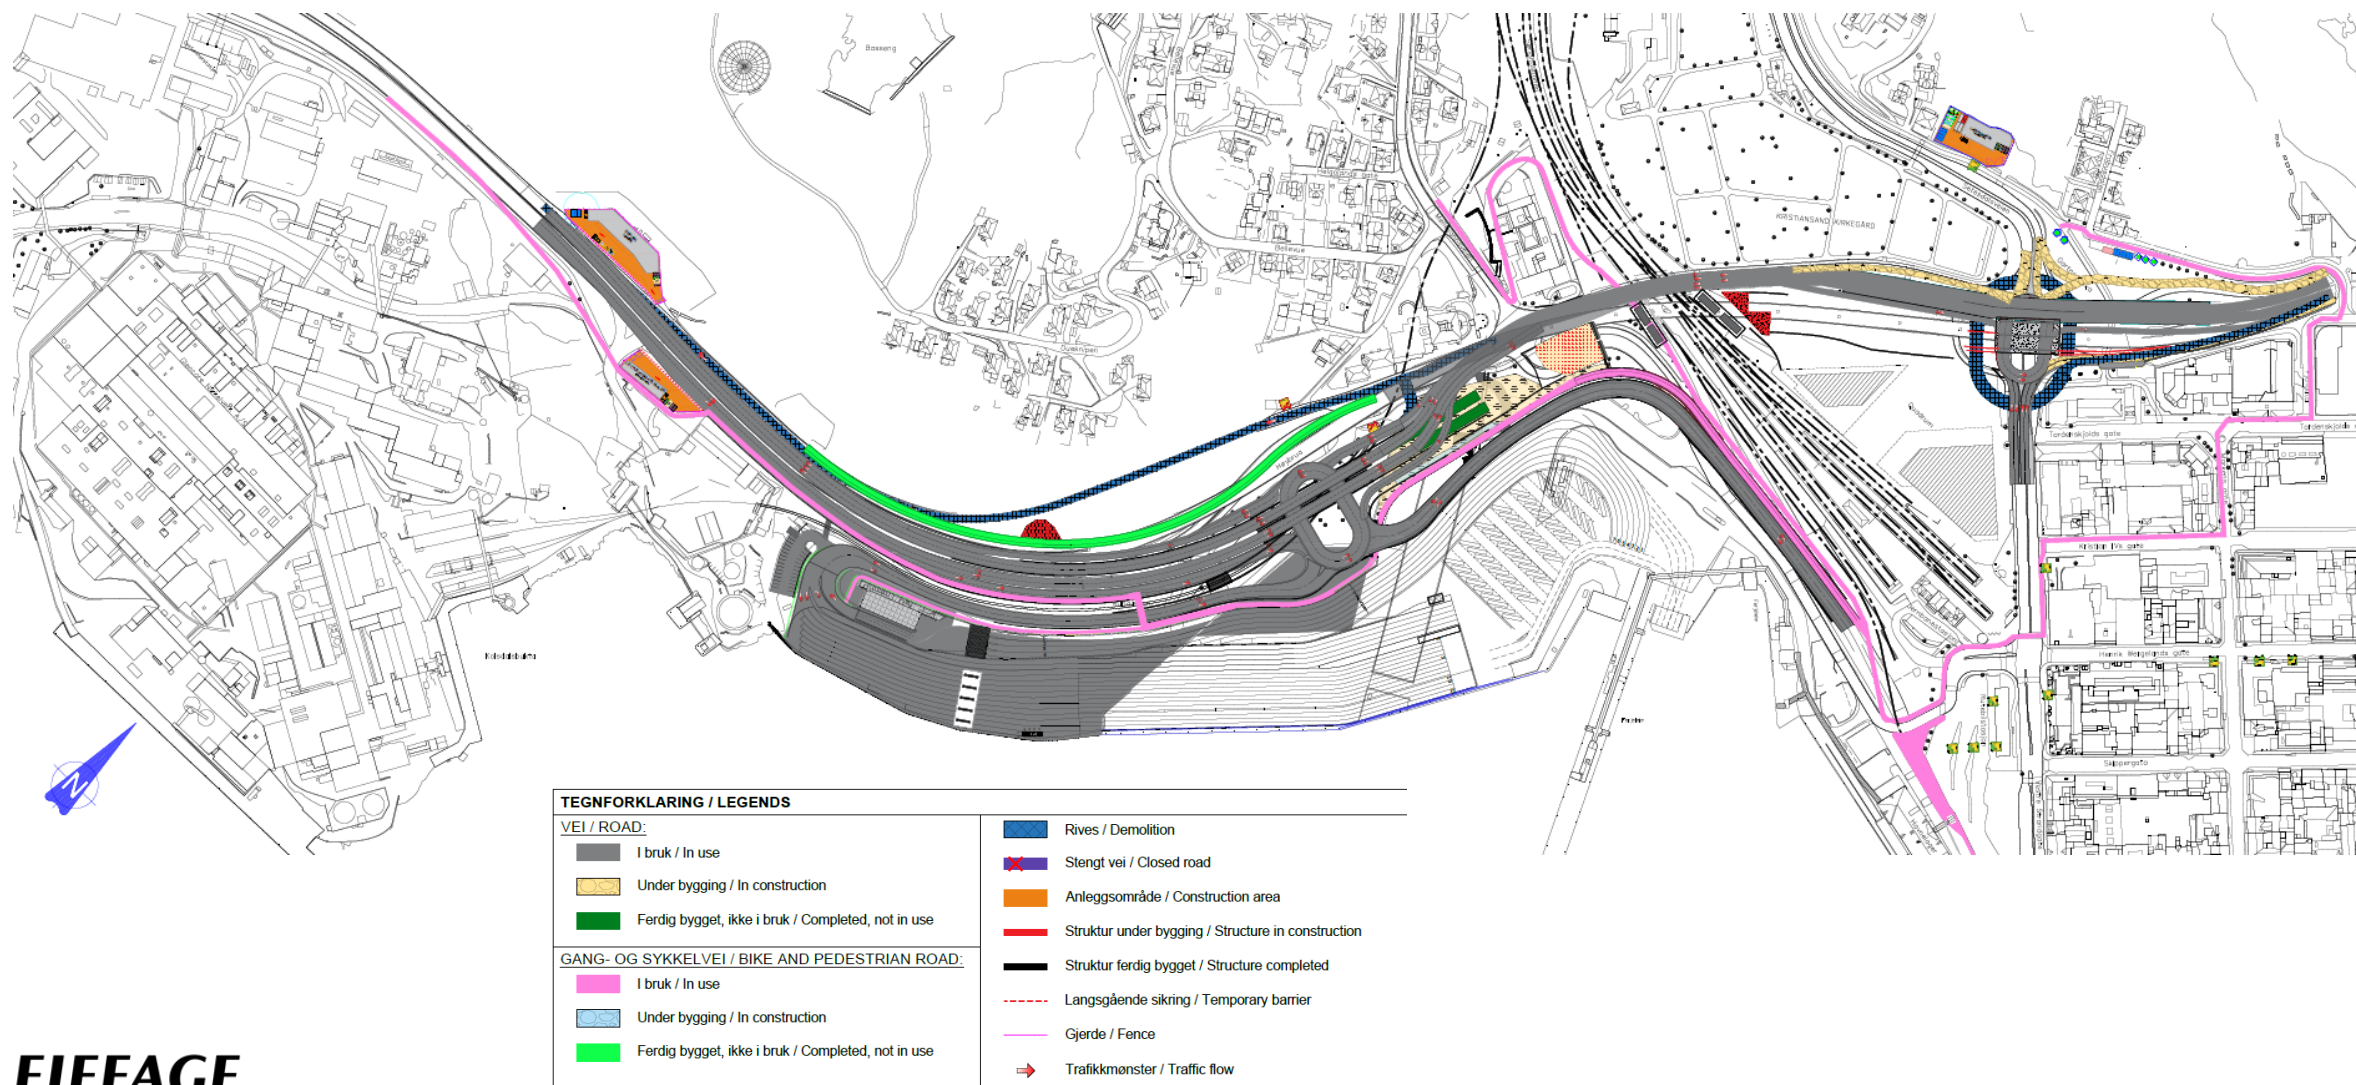

Overordnet faseplaner

Fase B.5


Periode: 16.03.2027 – 11.09.2027

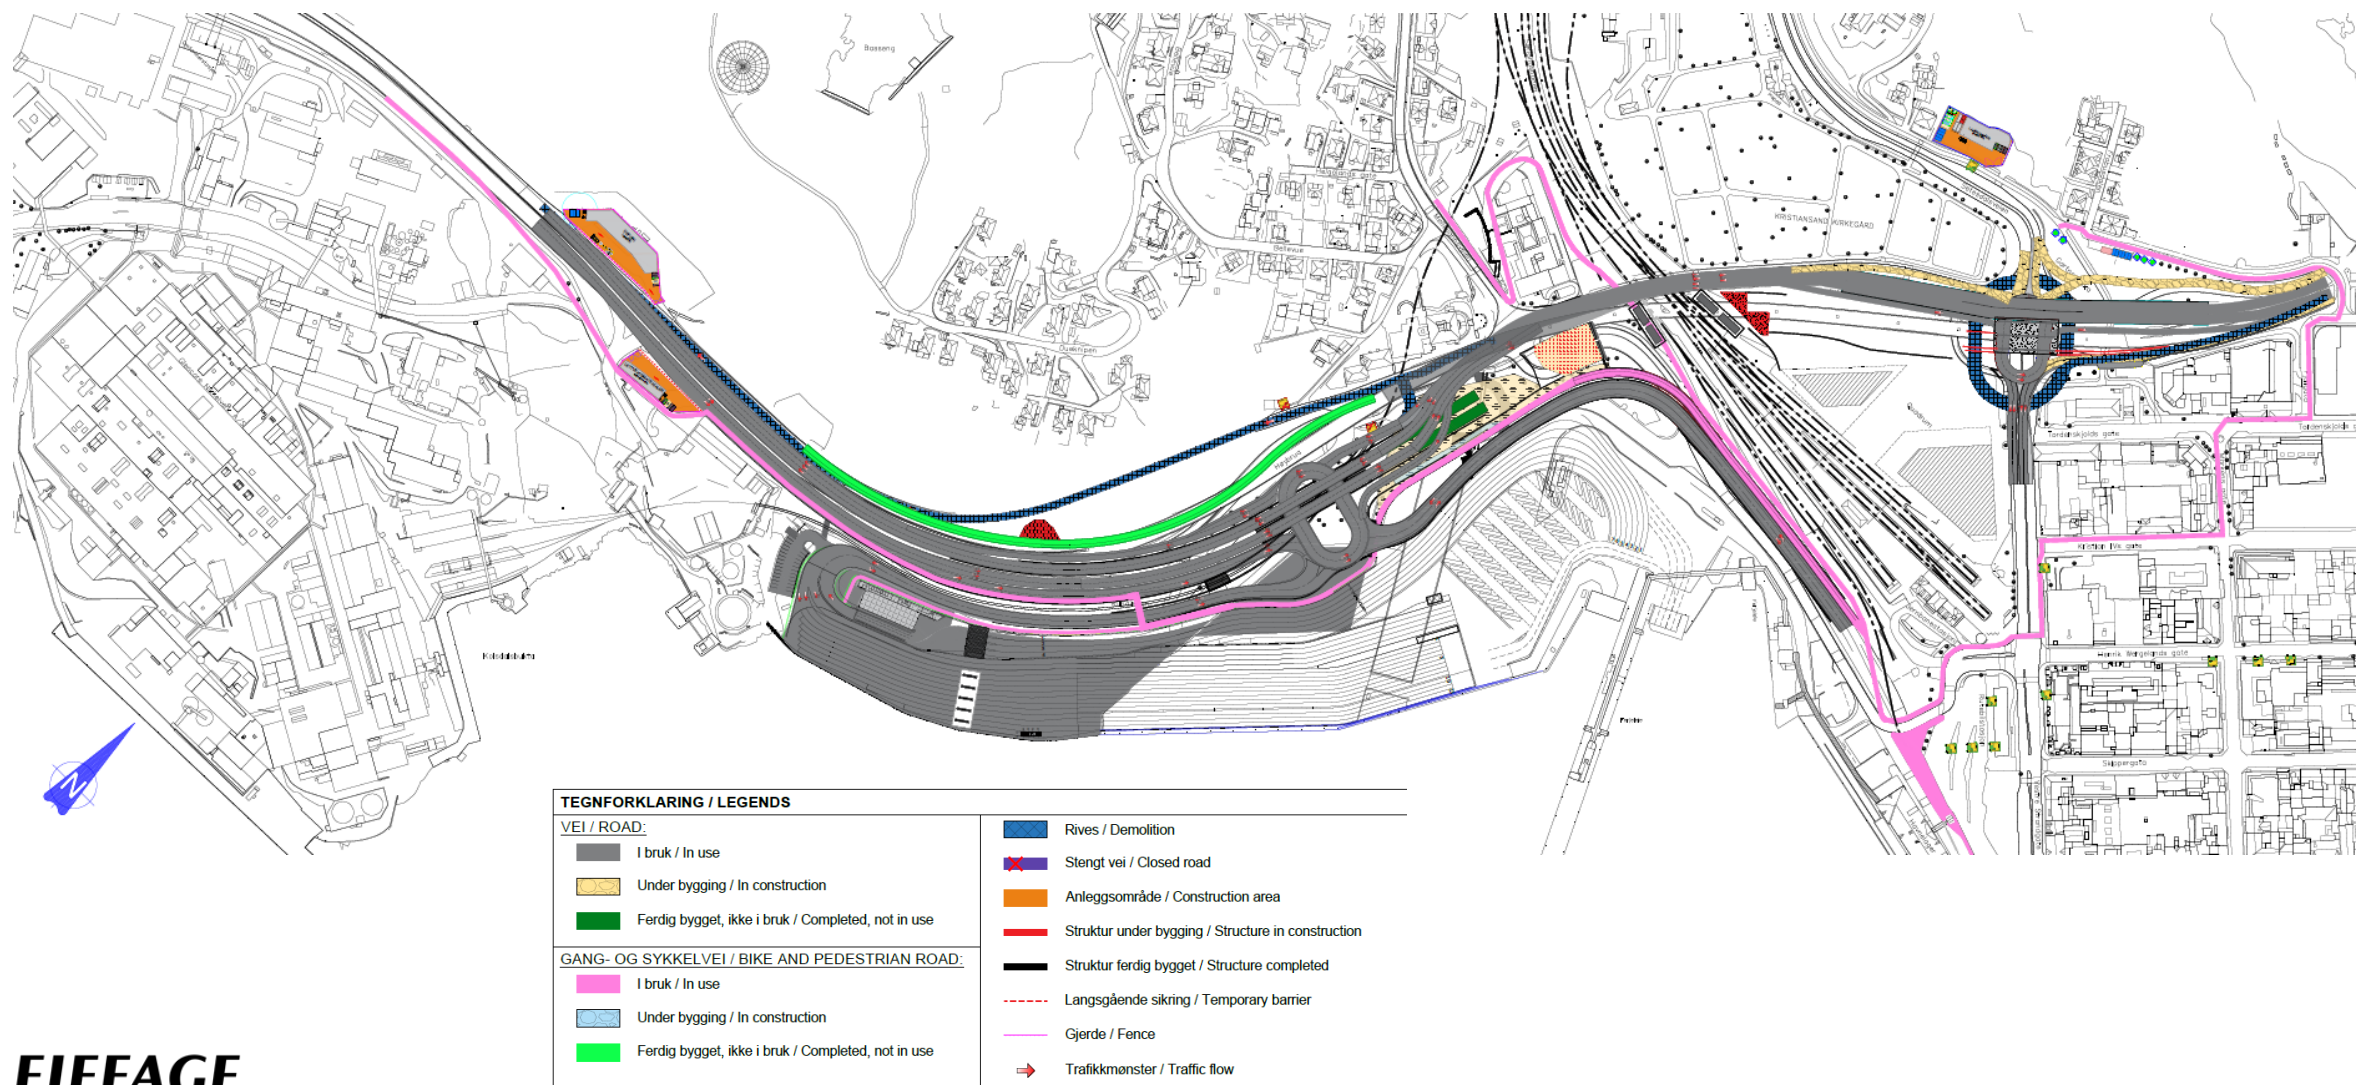

Overordnet faseplaner

Fase B.6


Periode: 13.09.2027 – 02.02.2028

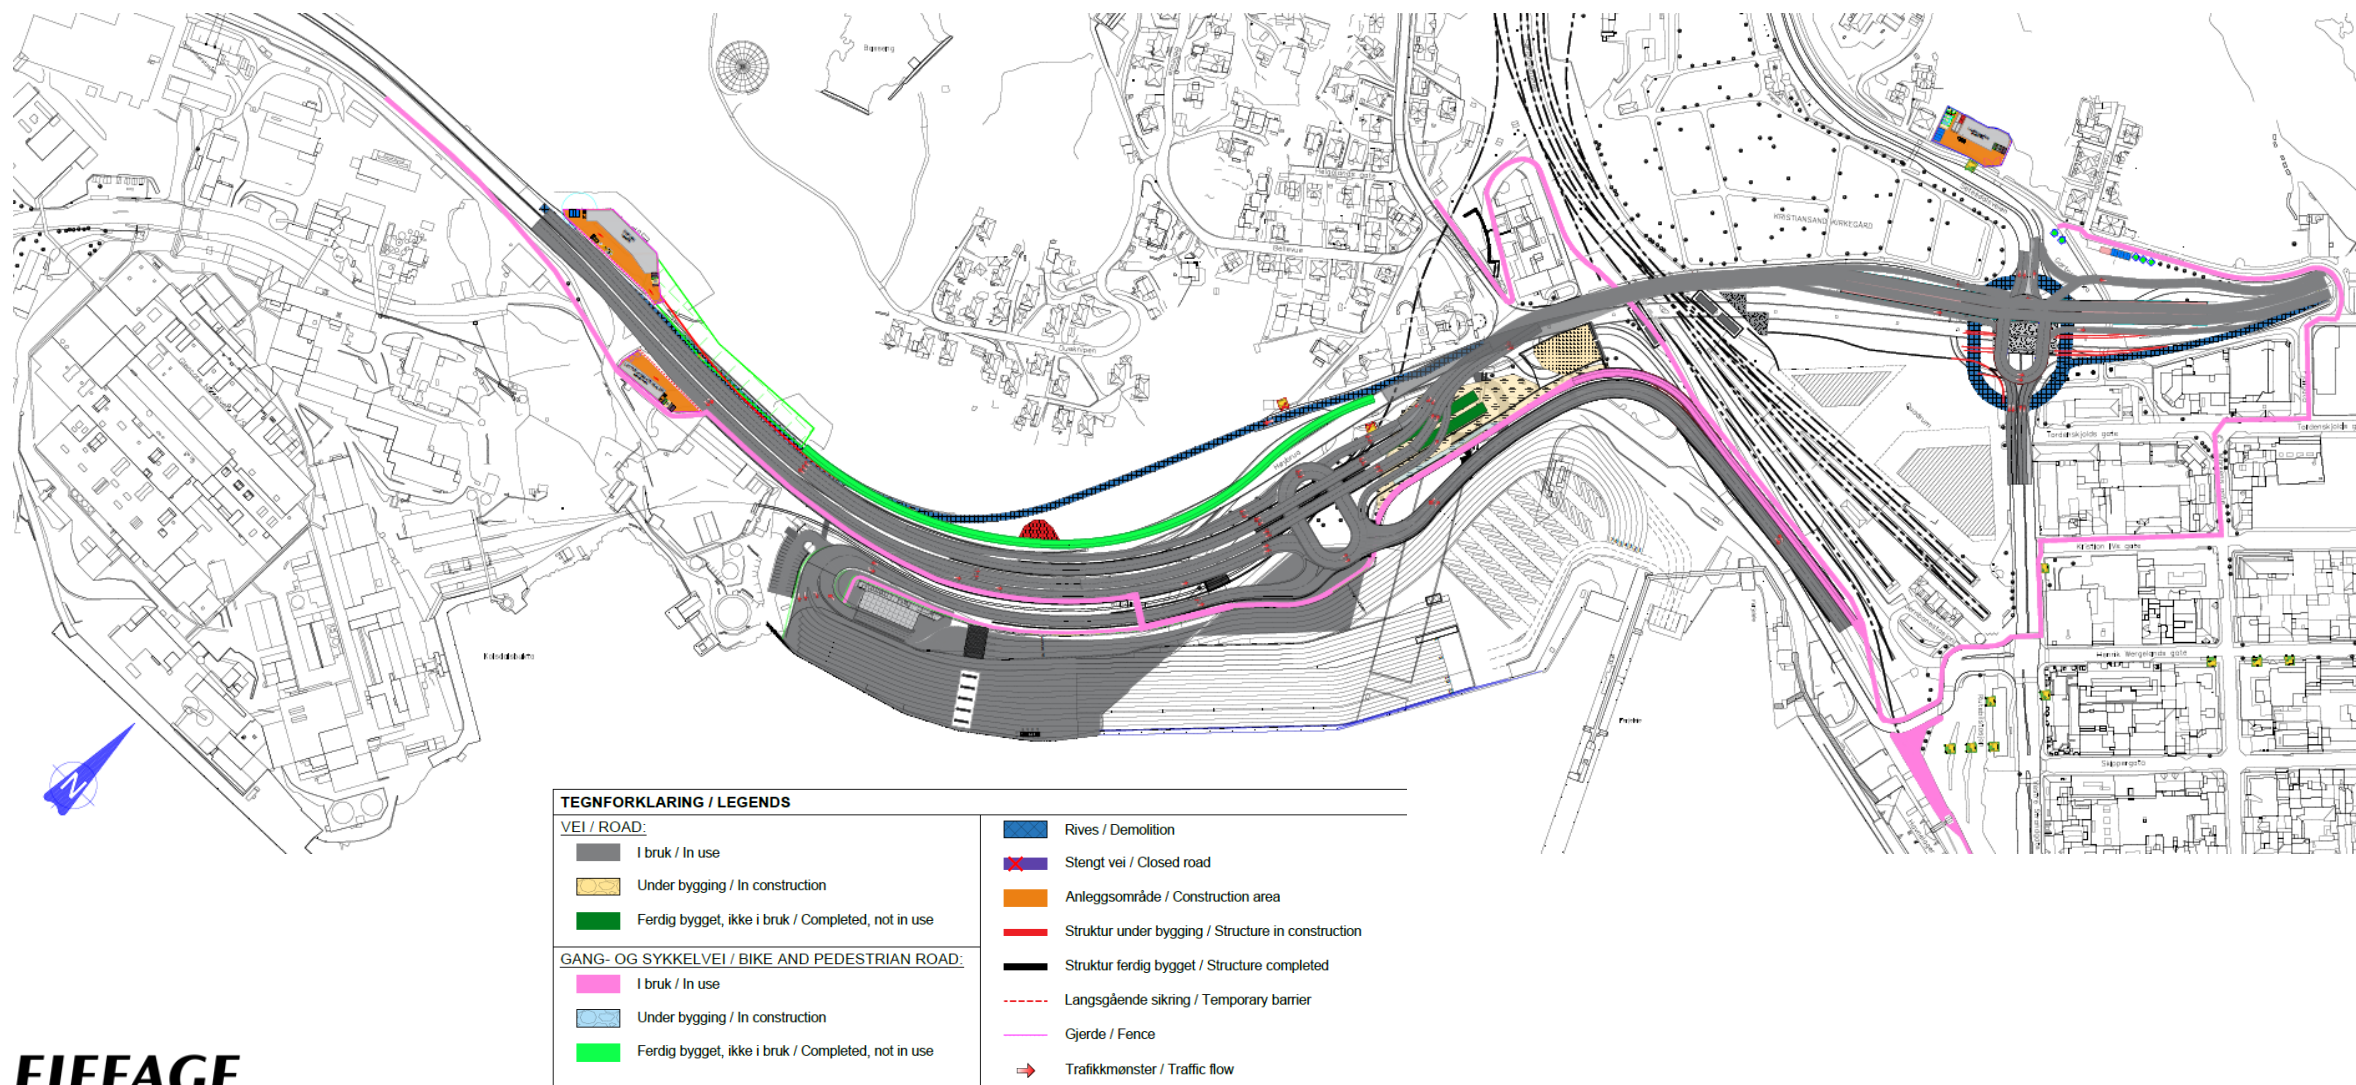

Overordnet faseplaner

Fase B.7


Periode: 03.11.2027 – 05.02.2028

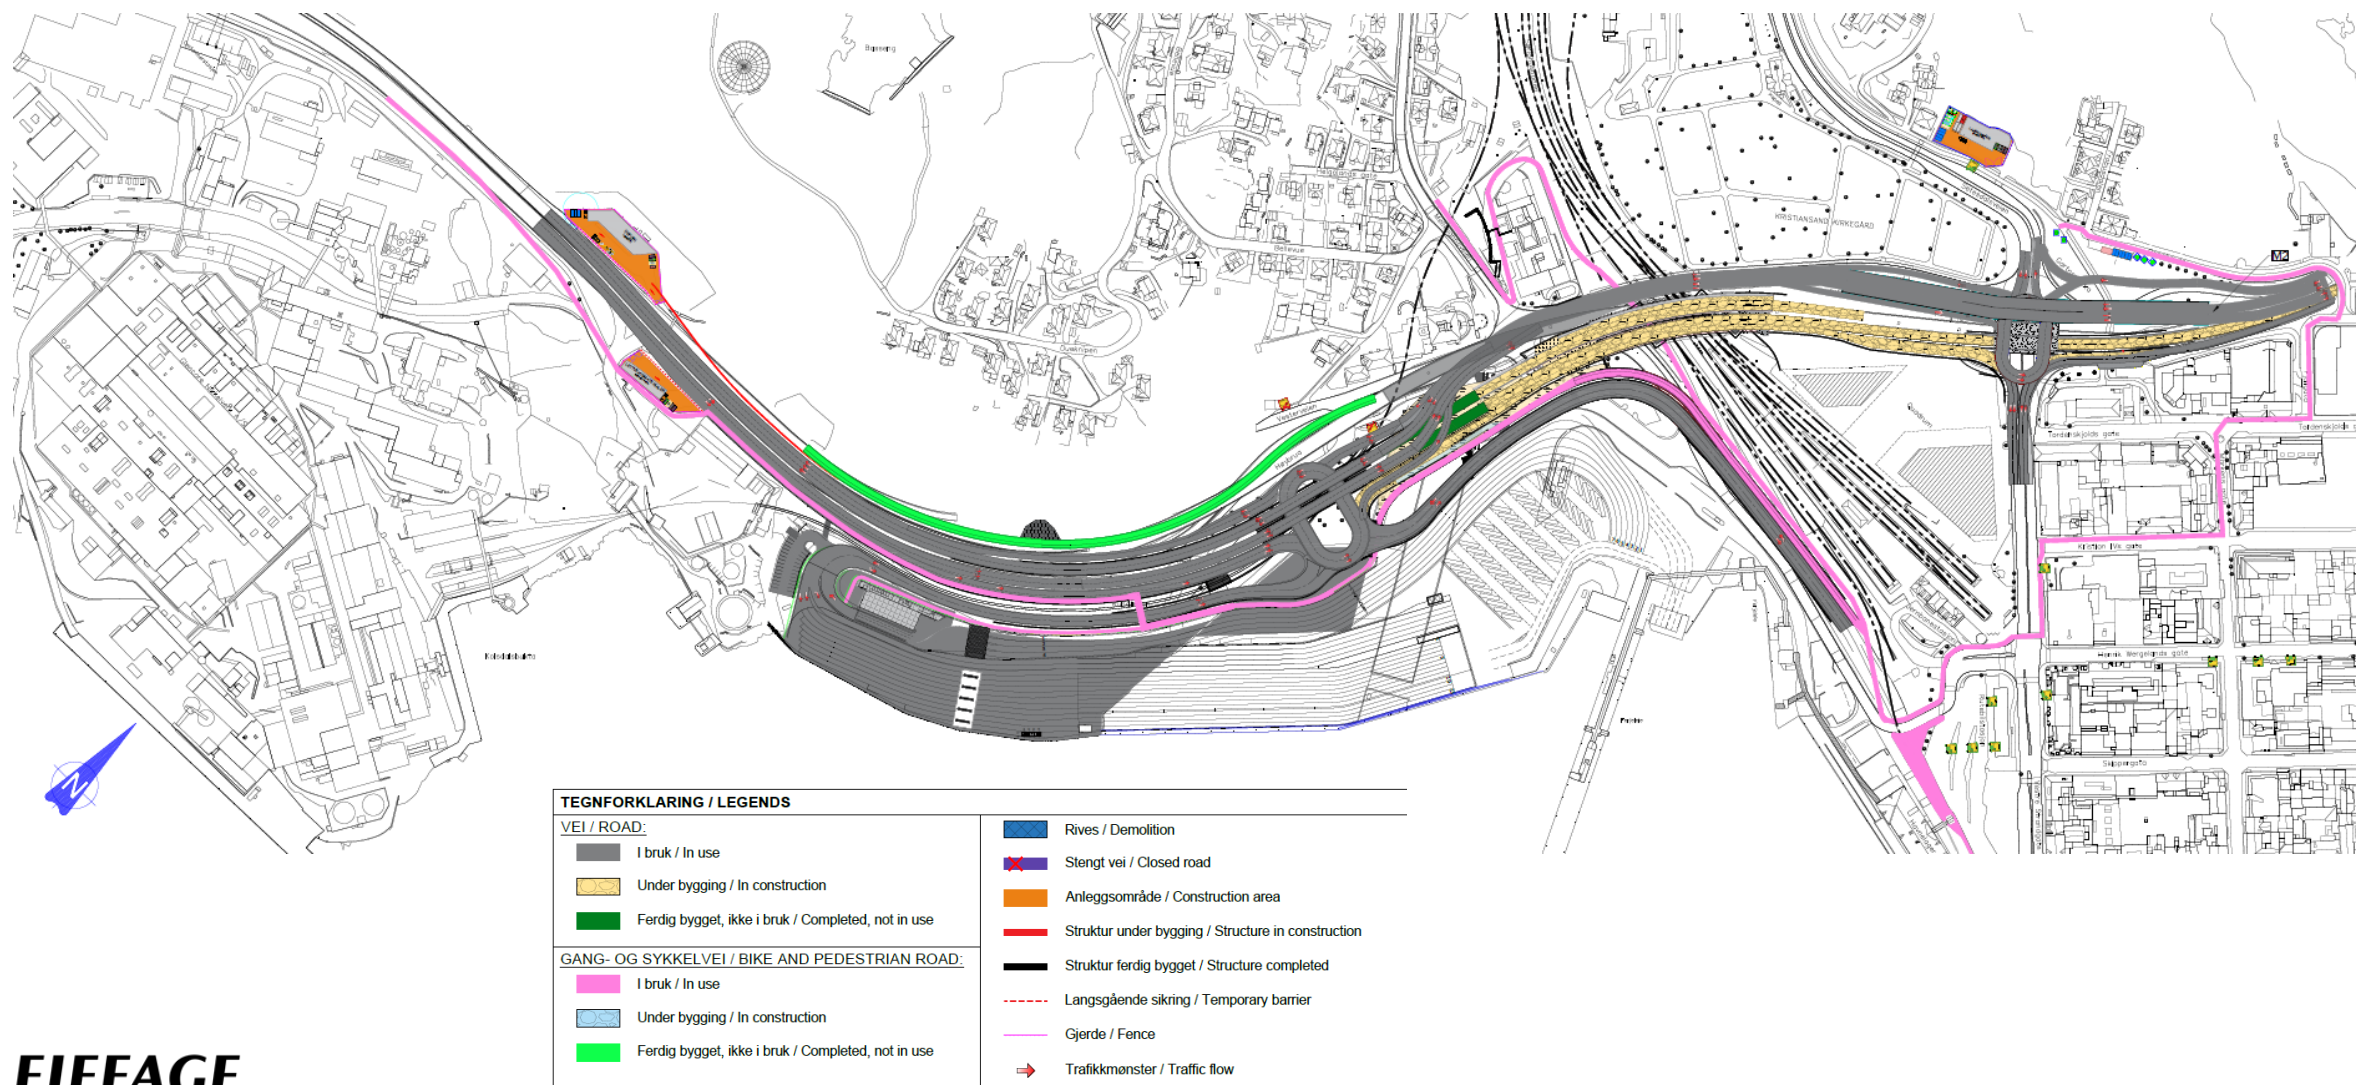

Overordnet faseplaner

Fase C.1


Periode: 07.02.2028 – 15.09.2028

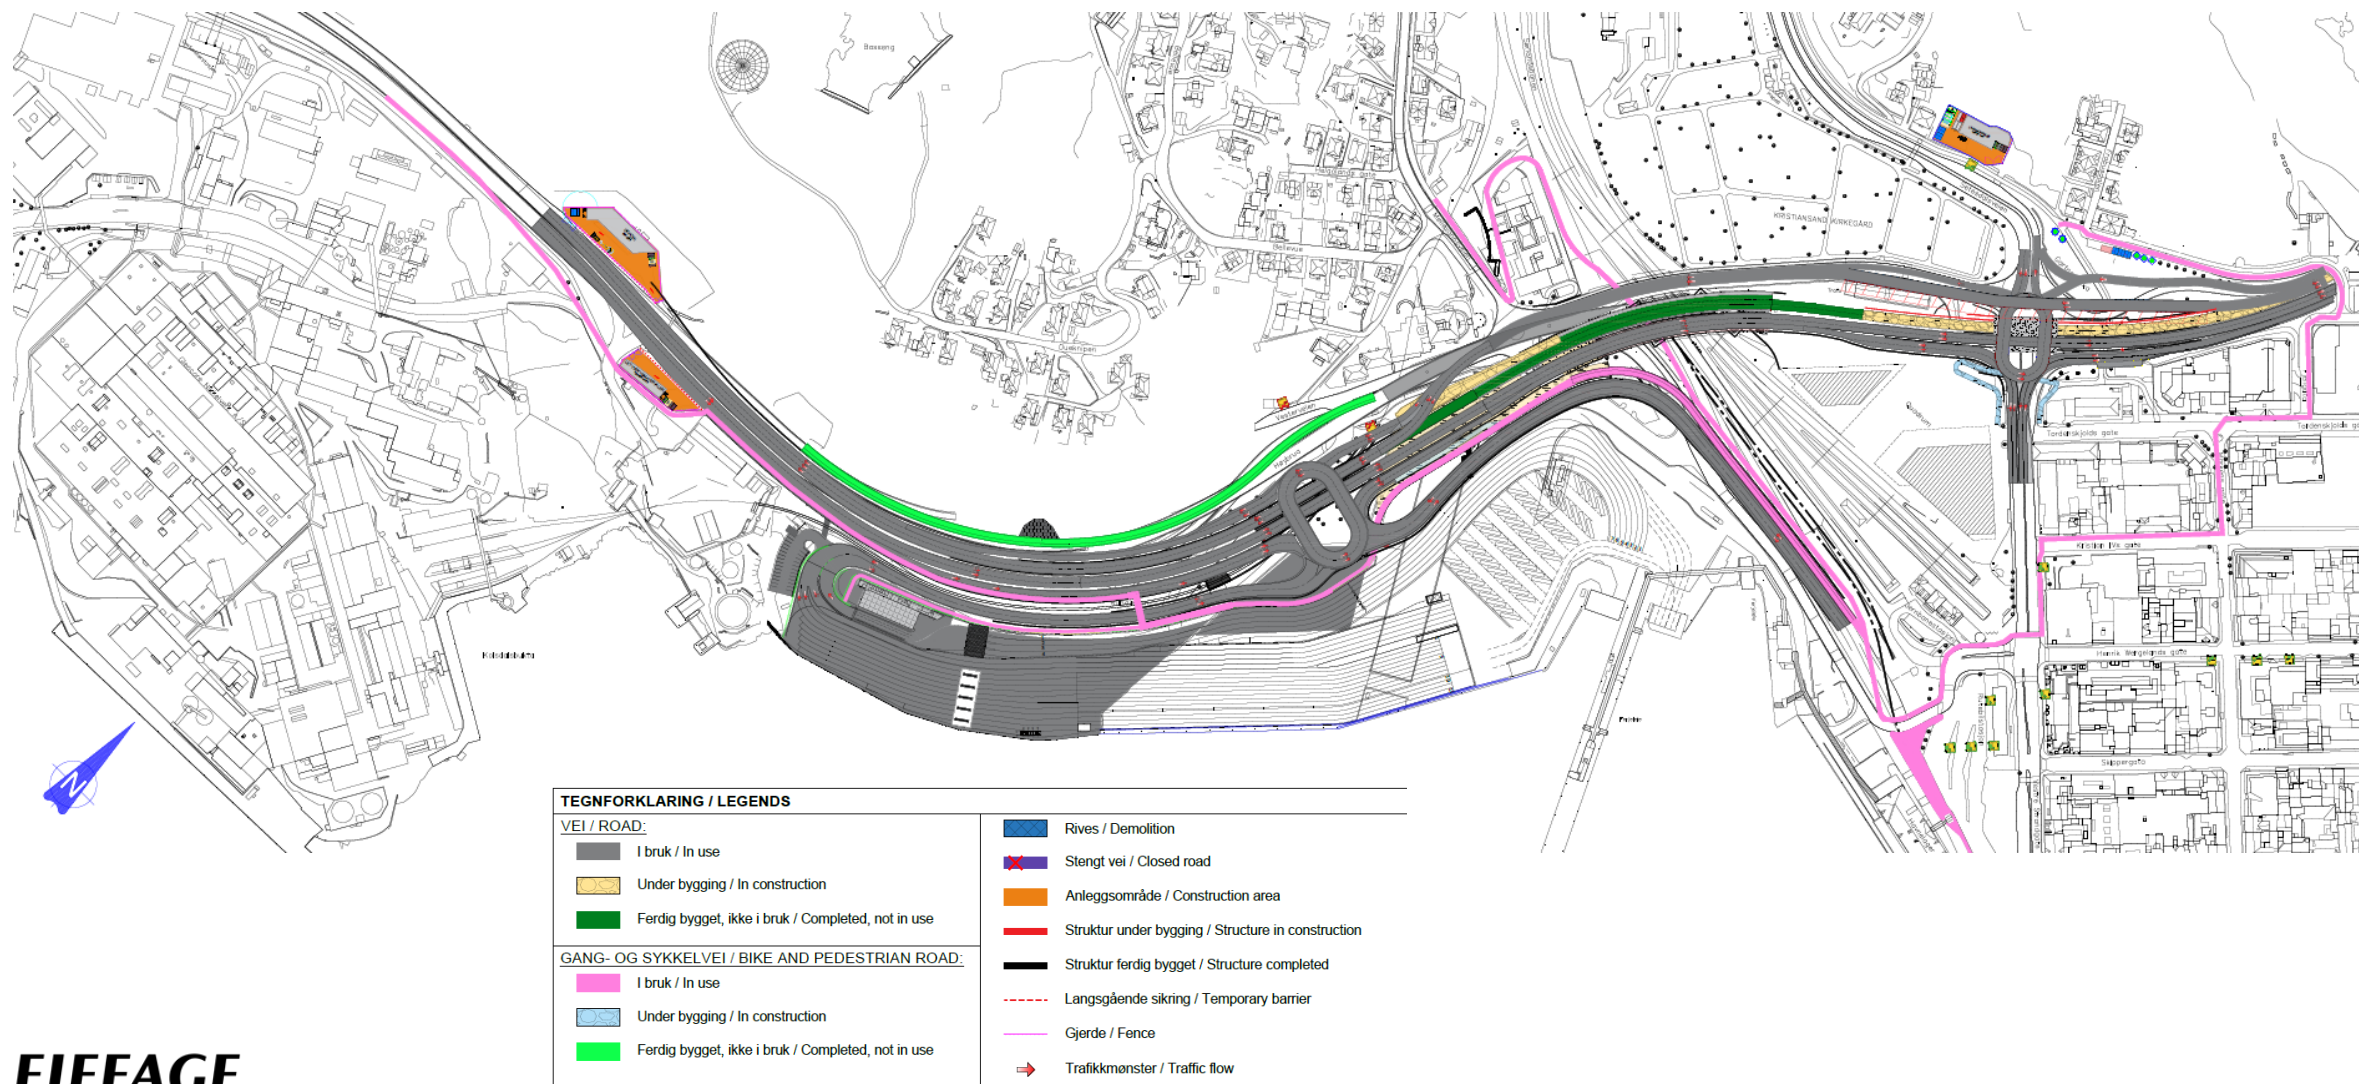

Overordnet faseplaner

Fase D.1


Periode: 15.09.2028 – 09.11.2028

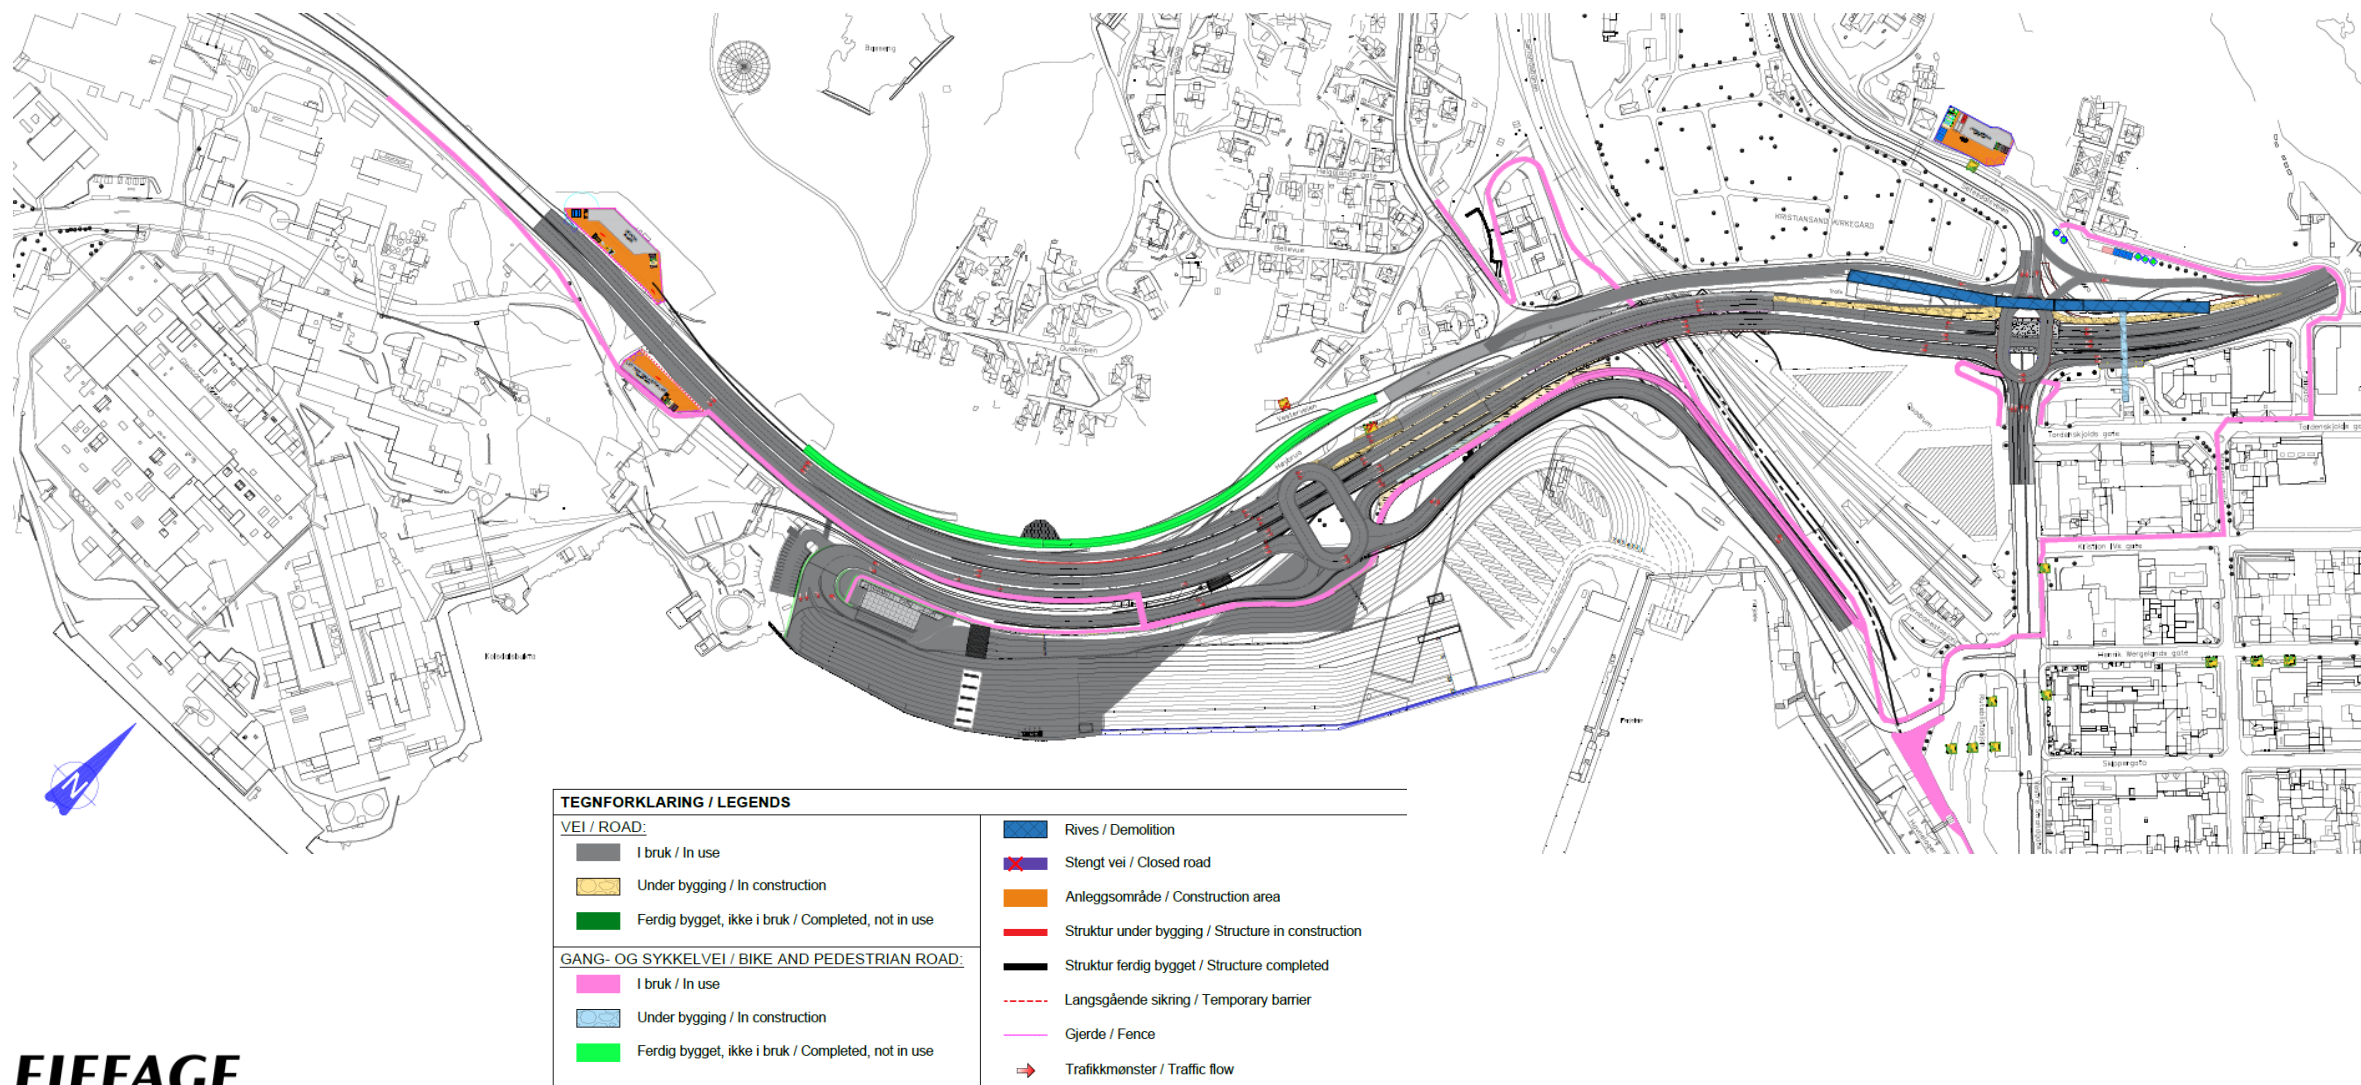

Overordnet faseplaner

Fase D.2


Periode: 10.11.2028 – 17.01.2029

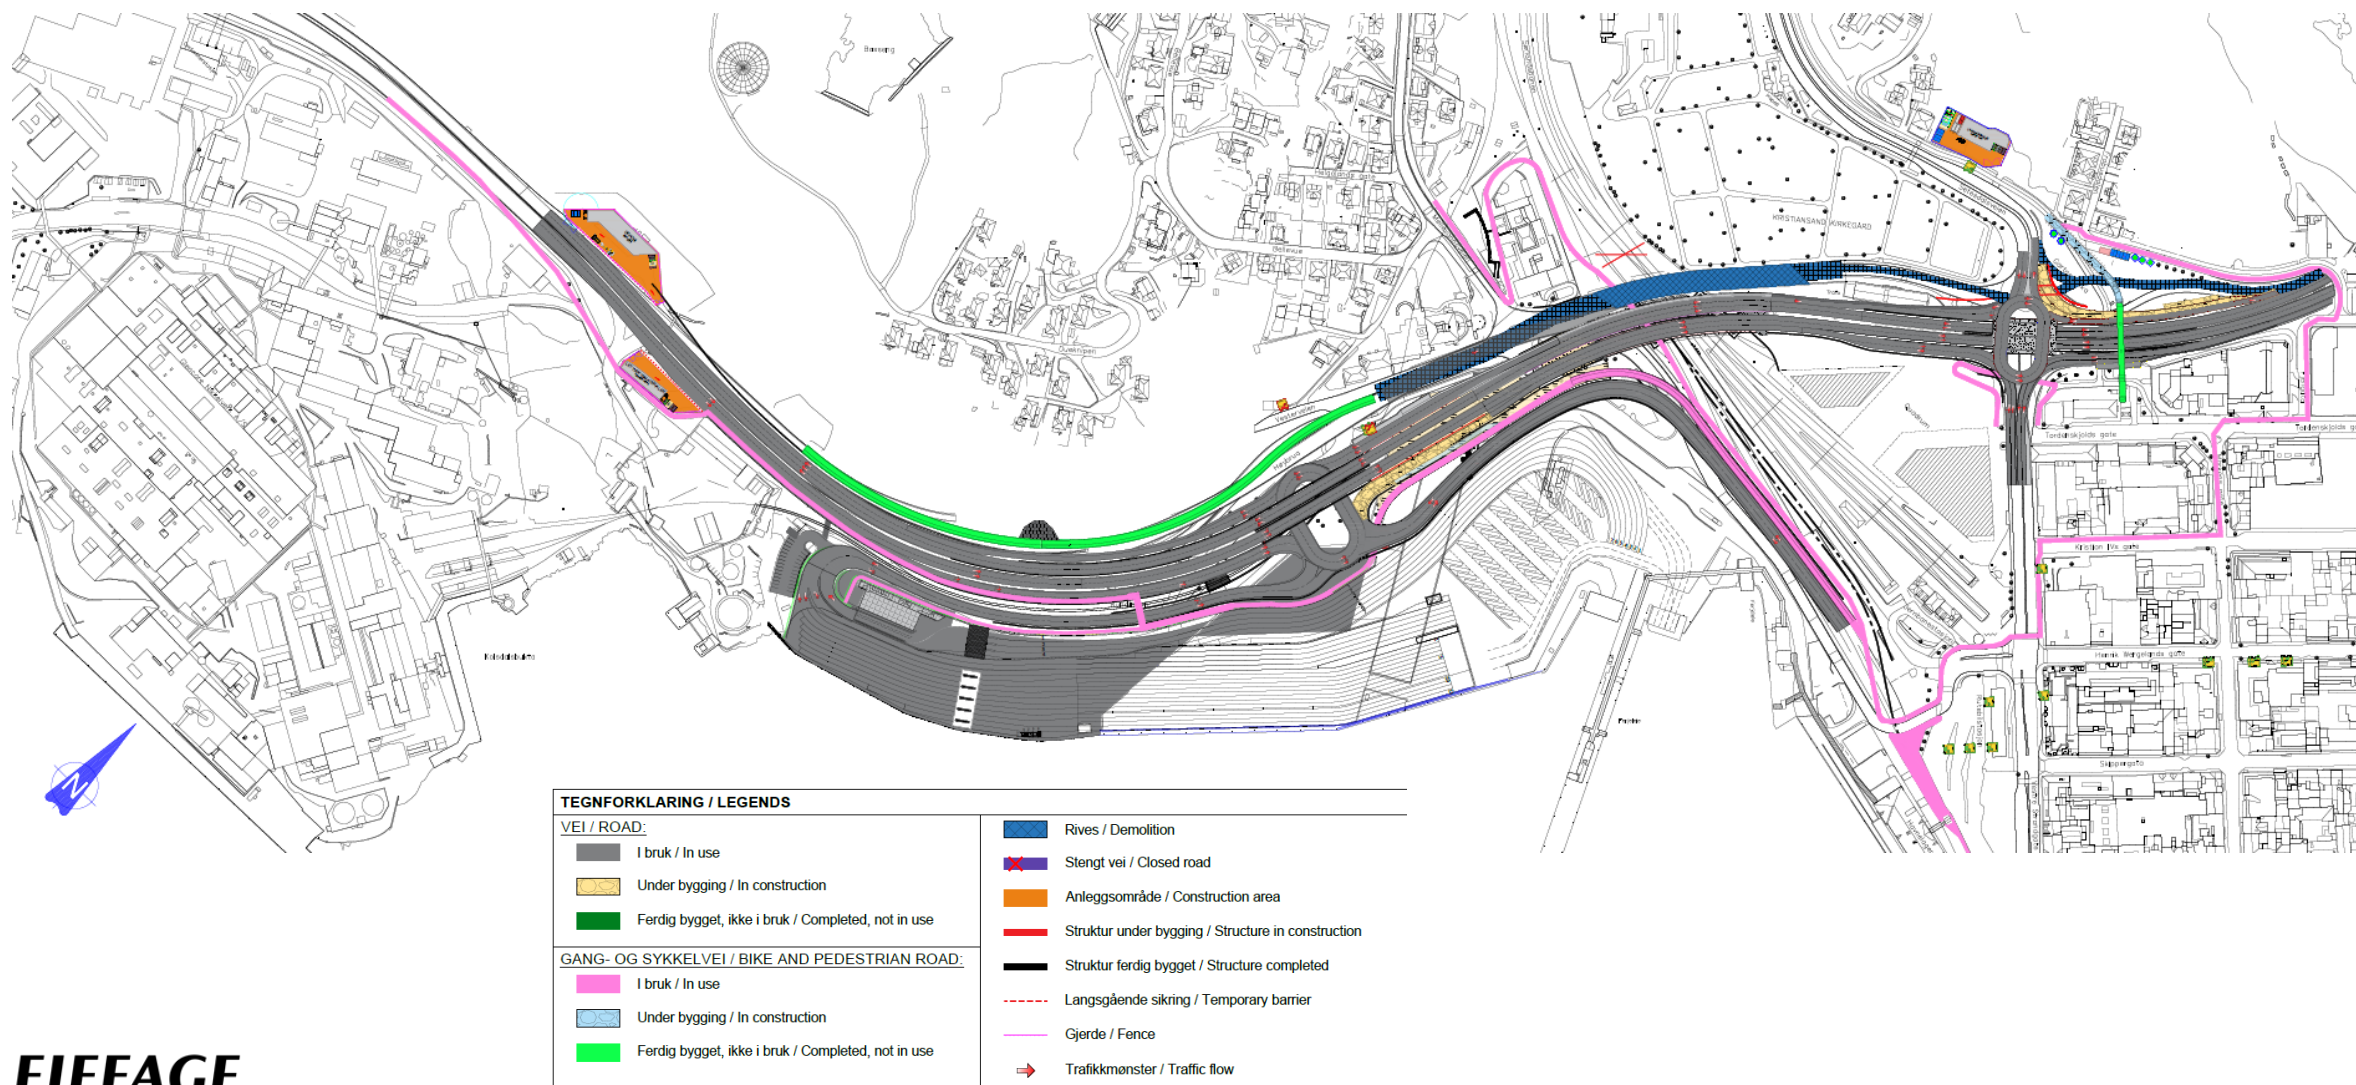

Overordnet faseplaner

Fase E.1

Periode: 15.12.2028 – 23.04.2029

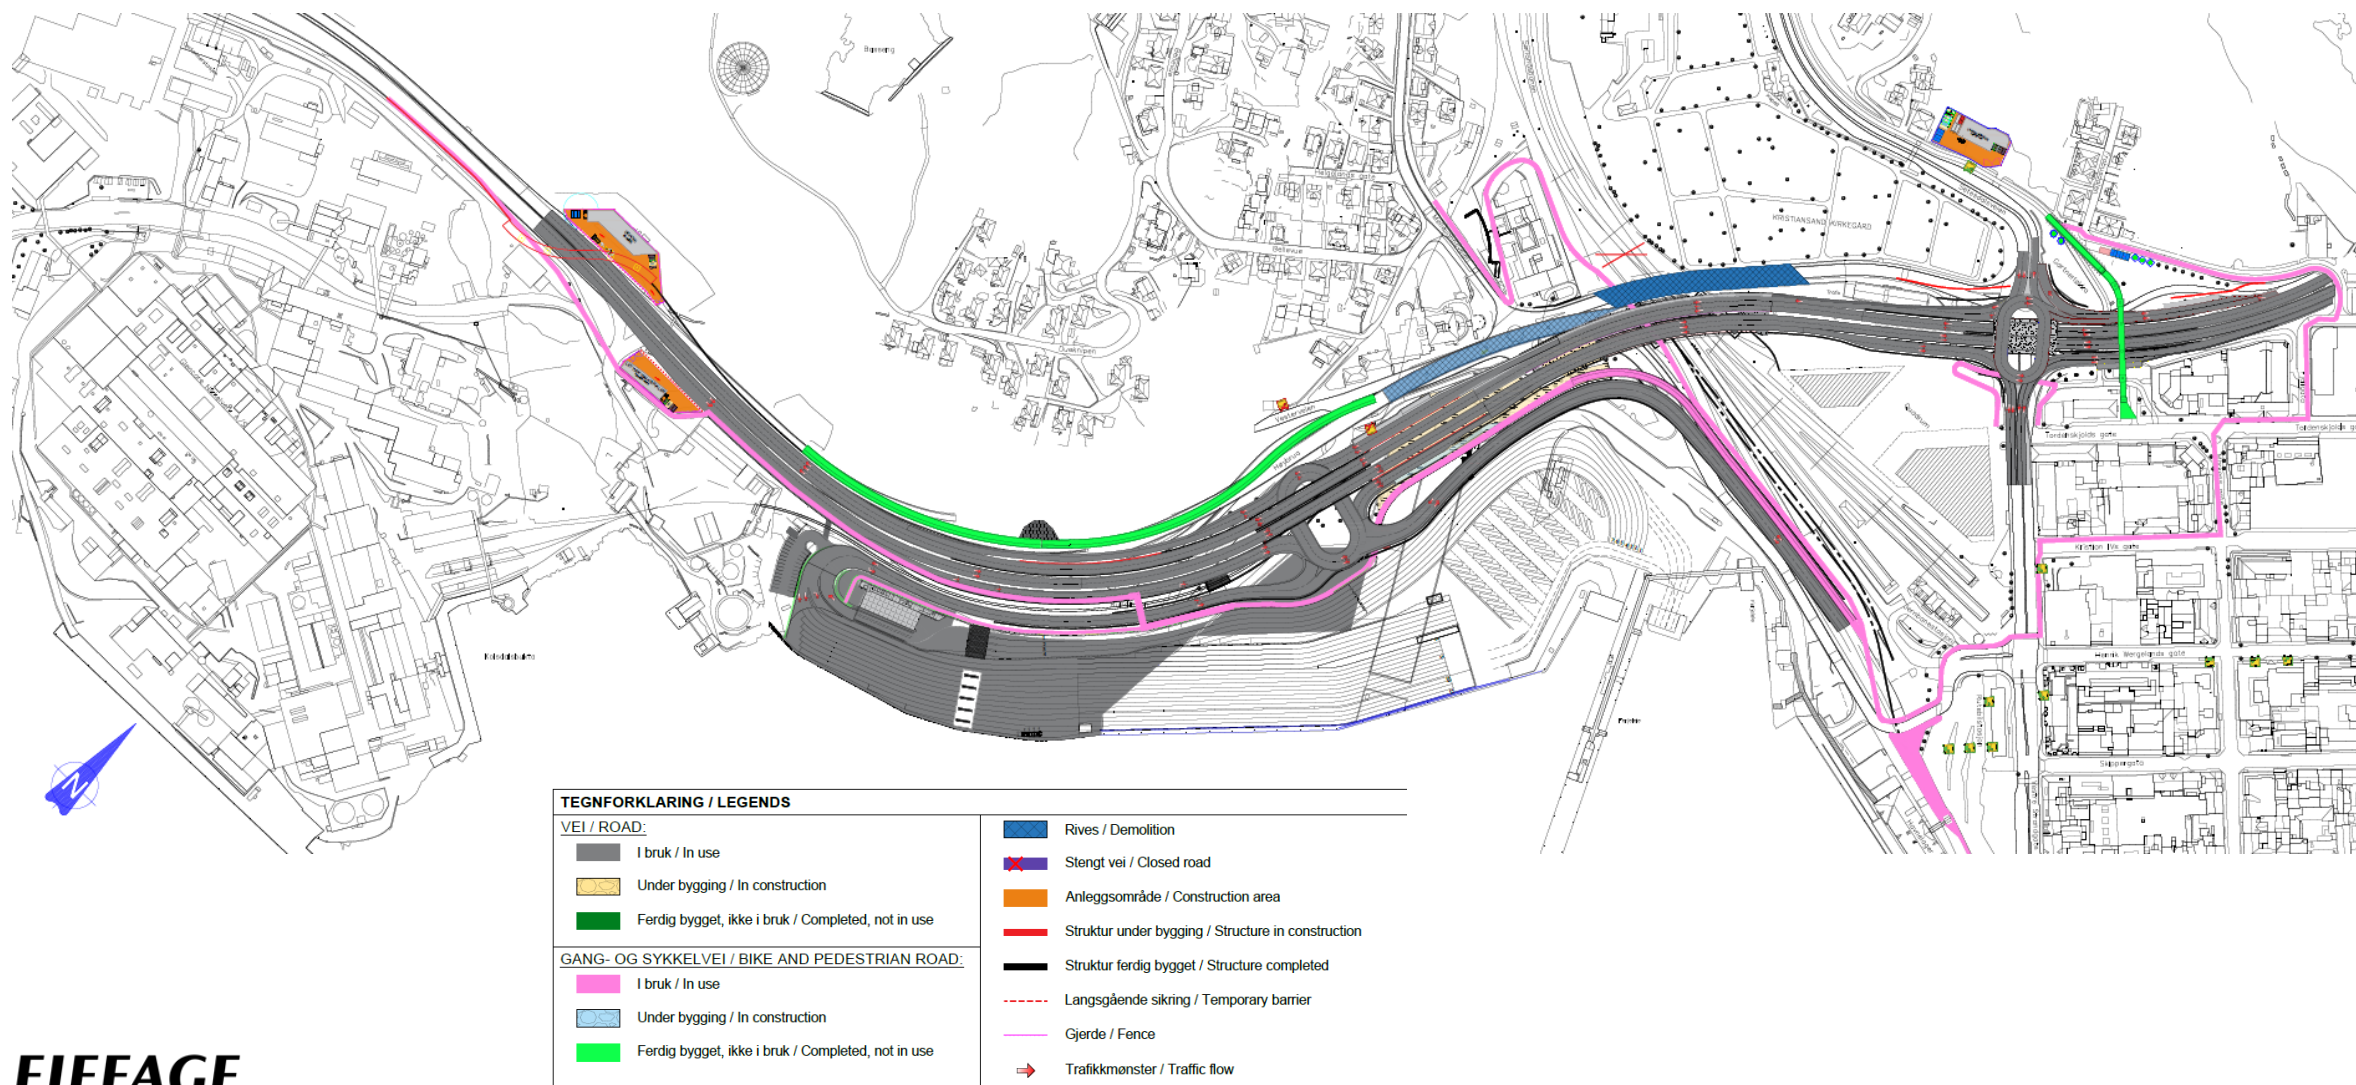


Fase E.2

Periode: 23.01.2029 – 06.06.2029

Overordnet faseplaner

Fase E.3


Periode: 11.05.2029 – 15.06.2029

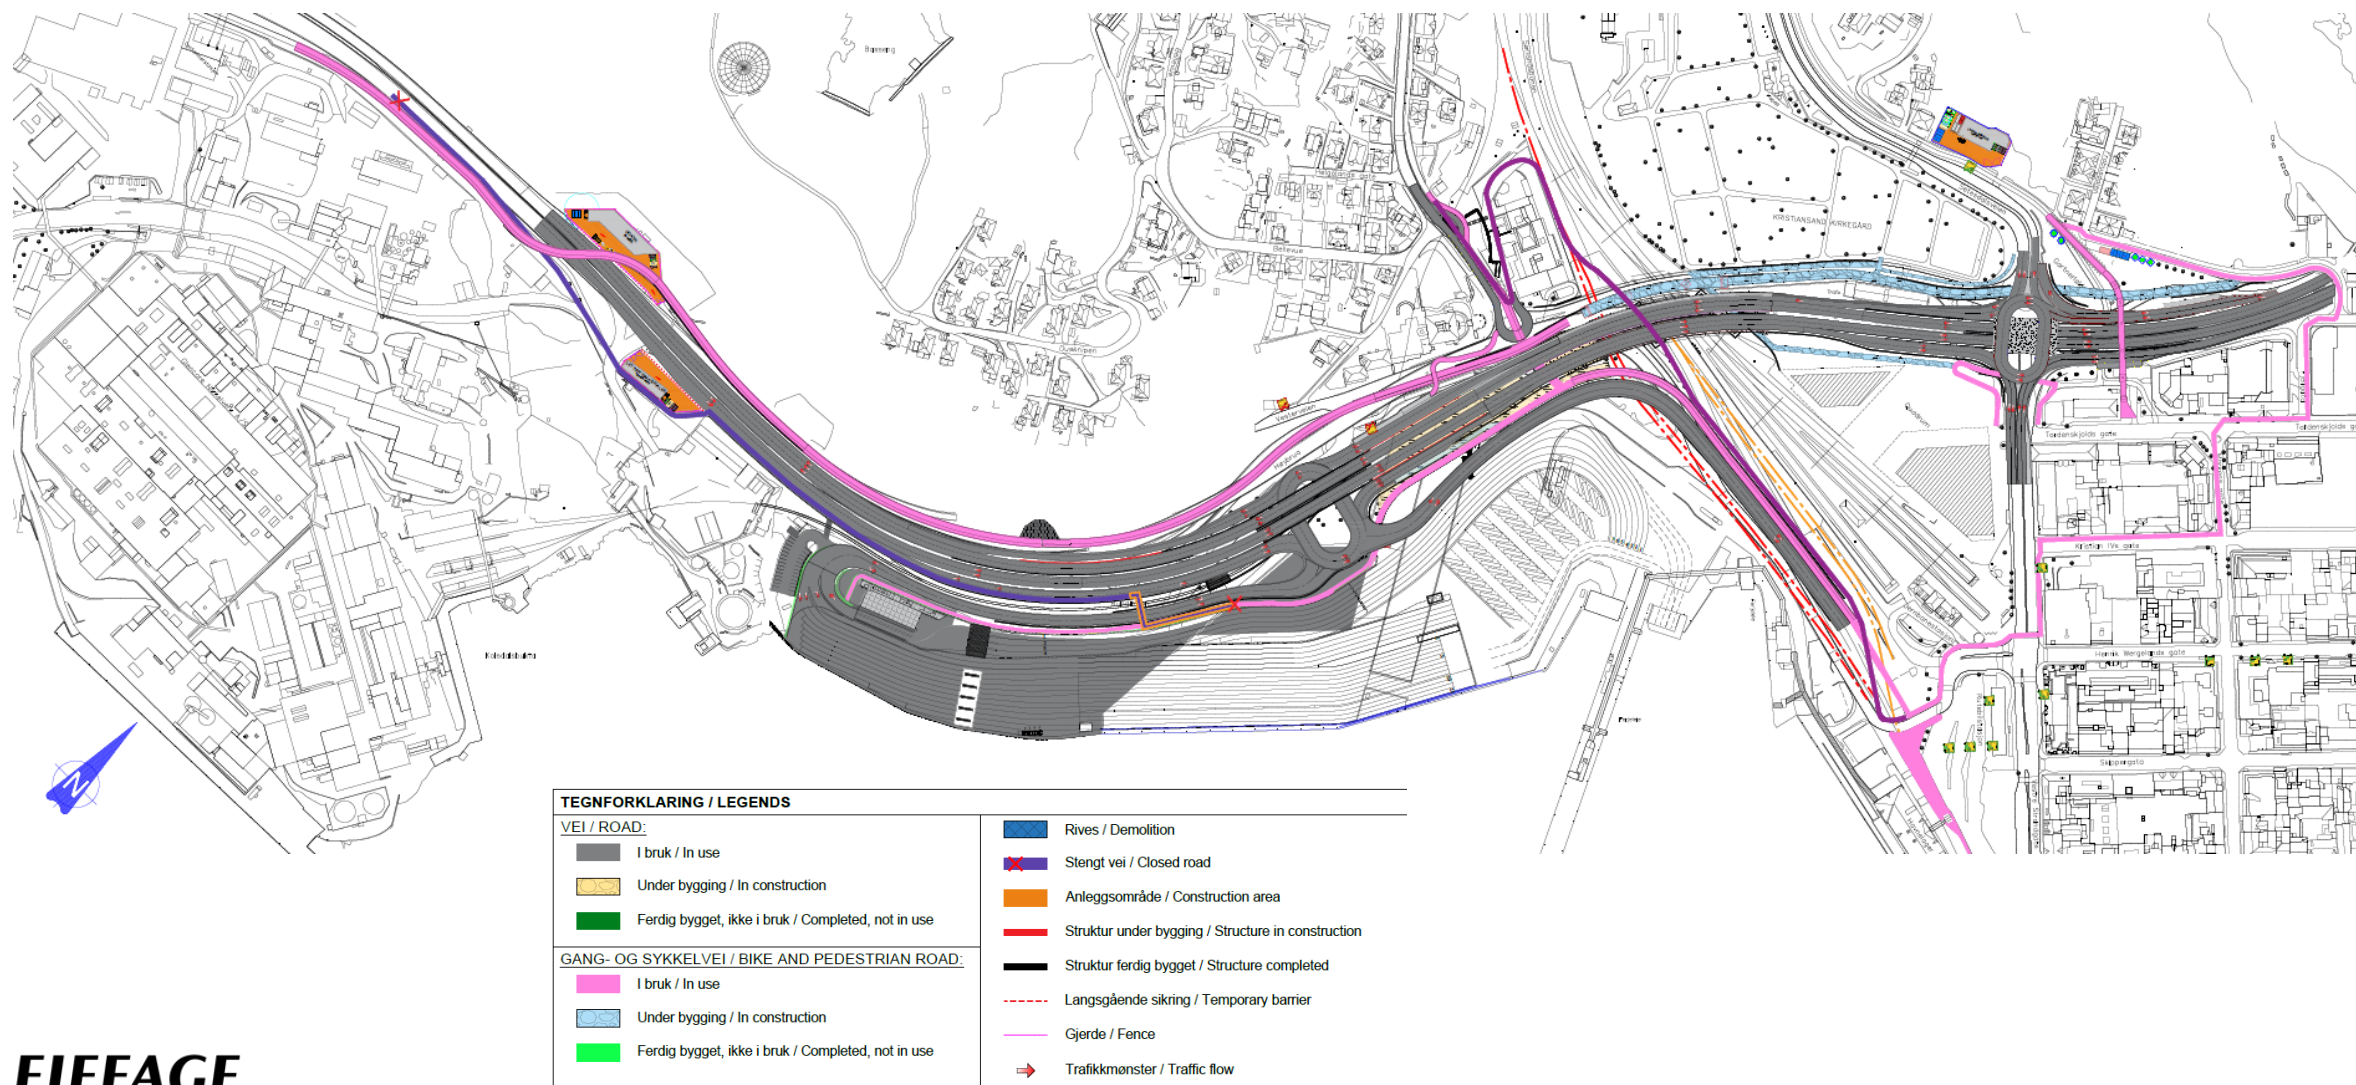

Overordnet faseplaner

Fase F.1

Periode: 12.01.2029 – 31.07.2029

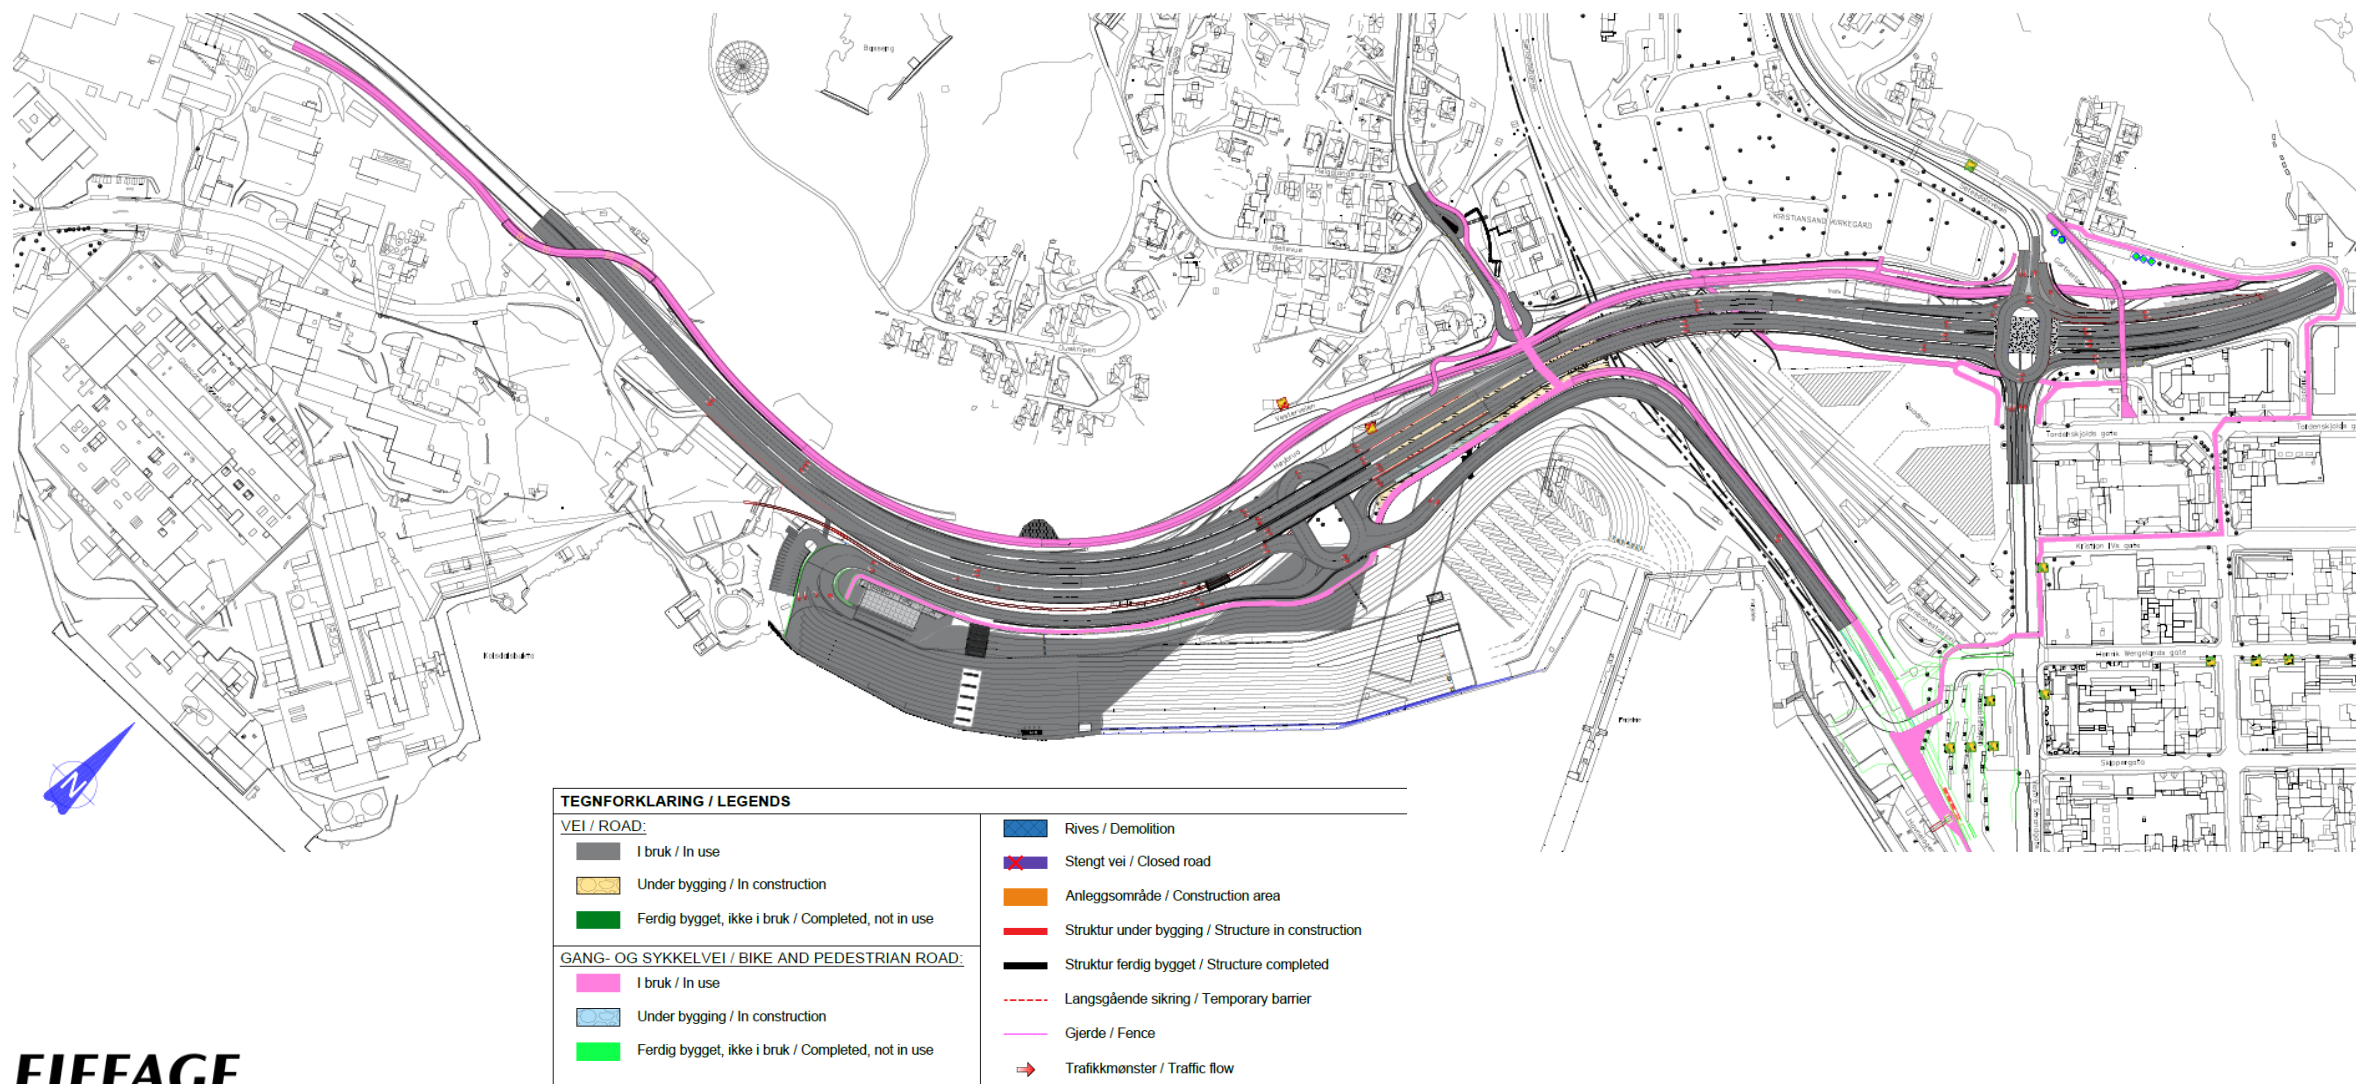


Fremdriftsplan

- Havneområdet:
 - Sprengningsarbeider blir utført samtidig med arbeidene i havnen.
 - Omlegging av trafikk til nye billettboader - 14. juni 2025 → Åpnet 13. juni 2025
 - Forsetter arbeidet på havneområdet med å legge til rette for ny infrastruktur
 - Gjenåpning av Glencore-jernbanen - 1. oktober 2025
- Gartnerløkkaområdet:
 - Starte arbeidene med midlertidig rundkjøring på Gartnerløkka - September 2025
 - Åpning av midlertidig rundkjøring på Gartnerløkka – November 2025

Beredskapsplan

- Beredskapsplan for prosjektet er godkjent
- Søknad om utplassering av vegviserskilt for beredskapsplan er sendt til godkjenning
- Tiltak på beredskapsveg vurderes

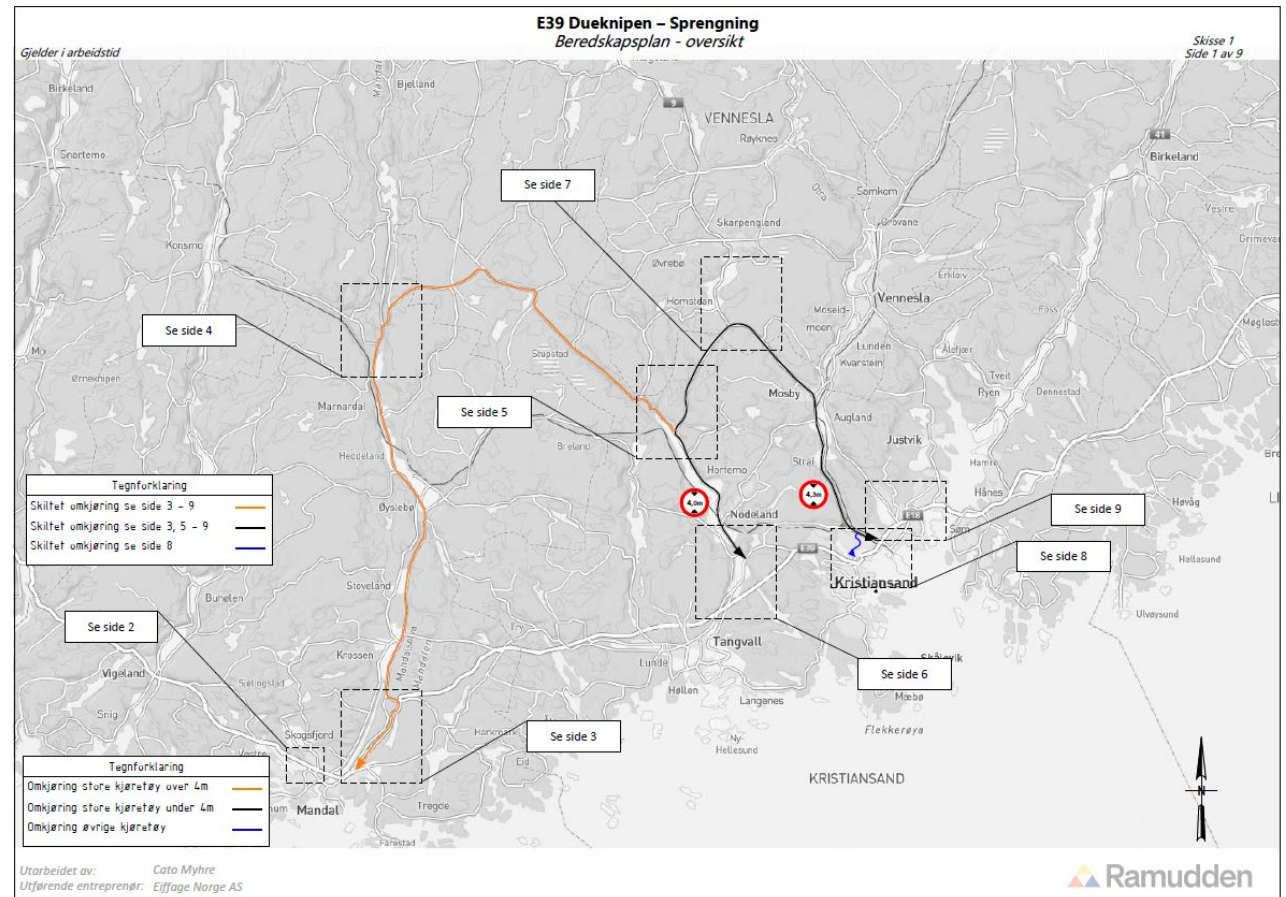

Behov for særmøter?

- Faste møteserier
 - Kristiansand Havn, hver 14. dag
 - Brukermøter Kristiansand Havn
 - BaneNOR, hver 14. dag
 - Nabomøter
 - Nødetater
 - Veieiere, brukere
 - Elektromøter
 - Ukentlig trafikk møter
 - Mange interne driftsmøter

Info fra deltakere

- Hendelser som bør hensyntas?
 - Tall Ships Races Kristiansand 2025 - onsdag 30. juli til lørdag 2. august 2025
 - Annet?

Eventuelt

- Spørsmål?

Takk for møtet
